

Project: PROYECTO CIUDAD DE LAS ART  
 ANALISIS DE IMPACTO DE TIEMPO #1A  
 Date: mar 6/10/14



ANEXO C

Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	noviembre 21		mayo 1		octubre 11		marzo 21		septiembre 1		febrero 11		julio 21		enero 1	
					11/18	2/3	4/21	7/7	9/22	12/8	2/23	5/11	7/27	10/12	12/28	3/15	5/31	8/16	11/1	1/17
52	Permiso de Construccion Final	21 días	sáb 8/16/14	sáb 9/6/14																
53	Remisiones	165 días	jue 6/26/14	lun 12/8/14																
54	Sometimiento	30 días	jue 6/26/14	sáb 7/26/14																
55	Pilotes	30 días	jue 6/26/14	sáb 7/26/14																
56	Dibujos de Taller de Acero de Refuerzo	30 días	jue 6/26/14	sáb 7/26/14																
57	Diseno de Mezcla de Concreto	30 días	jue 6/26/14	sáb 7/26/14																
58	Bloques de Concreto	30 días	jue 6/26/14	sáb 7/26/14																
59	Dibujos de taller - Acero Estructural	30 días	jue 6/26/14	sáb 7/26/14																
60	Sistema de Aislamiento	30 días	jue 6/26/14	sáb 7/26/14																
61	Puertas y Herrajes	30 días	jue 6/26/14	sáb 7/26/14																
62	Ventanas y Cristalería	30 días	jue 6/26/14	sáb 7/26/14																
63	Acabados de Piso	30 días	jue 6/26/14	sáb 7/26/14																
64	Acabados de Pared	30 días	jue 6/26/14	sáb 7/26/14																
65	Paredes de Yeso	30 días	jue 6/26/14	sáb 7/26/14																
66	Cielo Raso	30 días	jue 6/26/14	sáb 7/26/14																
67	Pintura	30 días	jue 6/26/14	sáb 7/26/14																
68	Tubería y Materiales Sistema Sanitario	30 días	jue 6/26/14	sáb 7/26/14																
69	Tubería y Materiales Sistema Pluvial	30 días	jue 6/26/14	sáb 7/26/14																
70	Tubería y Materiales Sistema Agua Potable	30 días	jue 6/26/14	sáb 7/26/14																
71	Aparatos Sanitarios	30 días	jue 6/26/14	sáb 7/26/14																
72	Accesorios de Bano	30 días	jue 6/26/14	sáb 7/26/14																
73	Equipos y Materiales de A/A	30 días	jue 6/26/14	sáb 7/26/14																
74	Sistema Contra Fuegos	30 días	jue 6/26/14	sáb 7/26/14																
75	Tubería y Materiales Sistema Electrico	30 días	jue 6/26/14	sáb 7/26/14																
76	Cableado Electrico, Sistema de Comunicaciones y Alarm	30 días	jue 6/26/14	sáb 7/26/14																
77	Equipo Alarma Contra Incendio	30 días	jue 6/26/14	sáb 7/26/14																
78	Equipos Electricos	30 días	jue 6/26/14	sáb 7/26/14																
79	Lamparas	30 días	jue 6/26/14	sáb 7/26/14																
80	Sistema de Elevador	30 días	jue 6/26/14	sáb 7/26/14																
81	Jardinería	30 días	jue 6/26/14	sáb 7/26/14																
82	Marcado de Pavimento y Rotulacion	30 días	jue 6/26/14	sáb 7/26/14																
83	Sistema de Impermeabilizacion	30 días	jue 6/26/14	sáb 7/26/14																
84	Planta de Tratamiento	30 días	jue 6/26/14	sáb 7/26/14																
85	Infraestructura Sanitaria	30 días	jue 6/26/14	sáb 7/26/14																
86	Infraestructura Pluvial	30 días	jue 6/26/14	sáb 7/26/14																
87	Infraestructura Potable	30 días	jue 6/26/14	sáb 7/26/14																
88	Infraestructura Electrica	30 días	jue 6/26/14	sáb 7/26/14																
89	Equipo Cisterna	30 días	jue 6/26/14	sáb 7/26/14																
90	Alumbrado Publico	30 días	jue 6/26/14	sáb 7/26/14																
91	Generador Electrico	30 días	jue 6/26/14	sáb 7/26/14																
92	Aprobacion	15 días	sáb 7/26/14	dom 8/10/14																
93	Pilotes	15 días	sáb 7/26/14	dom 8/10/14																
94	Dibujos de Taller de Acero de Refuerzo	15 días	sáb 7/26/14	dom 8/10/14																
95	Diseno de Mezcla de Concreto	15 días	sáb 7/26/14	dom 8/10/14																
96	Bloques de Concreto	15 días	sáb 7/26/14	dom 8/10/14																
97	Dibujos de taller - Acero Estructural	15 días	sáb 7/26/14	dom 8/10/14																
98	Sistema de Aislamiento	15 días	sáb 7/26/14	dom 8/10/14																
99	Puertas y Herrajes	15 días	sáb 7/26/14	dom 8/10/14																
100	Ventanas y Cristalería	15 días	sáb 7/26/14	dom 8/10/14																
101	Acabados de Piso	15 días	sáb 7/26/14	dom 8/10/14																
102	Acabados de Pared	15 días	sáb 7/26/14	dom 8/10/14																
103	Paredes de Yeso	15 días	sáb 7/26/14	dom 8/10/14																

Project: PROYECTO CIUDAD DE LAS ART  
ANALISIS DE IMPACTO DE TIEMPO #1A  
Date: mar 6/10/14

Task		Project Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone	
Split		External Tasks		Manual Task		Start-only		Progress	
Milestone		External Milestone		Duration-only		Finish-only		Deadline	
Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks			

Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	noviembre 21		mayo 1		octubre 11		marzo 21		septiembre 1		febrero 11		julio 21		enero 1		
					11/18	2/3	4/21	7/7	9/22	12/8	2/23	5/11	7/27	10/12	12/28	3/15	5/31	8/16	11/1	1/17	
104	Cielo Raso	15 días	sáb 7/26/14	dom 8/10/14																	
105	Pintura	15 días	sáb 7/26/14	dom 8/10/14																	
106	Tubería y Materiales Sistema Sanitario	15 días	sáb 7/26/14	dom 8/10/14																	
107	Tubería y Materiales Sistema Pluvial	15 días	sáb 7/26/14	dom 8/10/14																	
108	Tubería y Materiales Sistema Agua Potable	15 días	sáb 7/26/14	dom 8/10/14																	
109	Aparatos Sanitarios	15 días	sáb 7/26/14	dom 8/10/14																	
110	Accesorios de Bano	15 días	sáb 7/26/14	dom 8/10/14																	
111	Equipos y Materiales de A/A	15 días	sáb 7/26/14	dom 8/10/14																	
112	Sistema Contra Fuegos	15 días	sáb 7/26/14	dom 8/10/14																	
113	Tubería y Materiales Sistema Electrico	15 días	sáb 7/26/14	dom 8/10/14																	
114	Cableado Electrico, Sistema de Comunicaciones y Alarm:	15 días	sáb 7/26/14	dom 8/10/14																	
115	Equipo Alarma Contra Incendio	15 días	sáb 7/26/14	dom 8/10/14																	
116	Equipos Electricos	15 días	sáb 7/26/14	dom 8/10/14																	
117	Lamparas	15 días	sáb 7/26/14	dom 8/10/14																	
118	Sistema de Elevador	15 días	sáb 7/26/14	dom 8/10/14																	
119	Jardinería	15 días	sáb 7/26/14	dom 8/10/14																	
120	Marcado de Pavimento y Rotulacion	15 días	sáb 7/26/14	dom 8/10/14																	
121	Sistema de Impermeabilizacion	15 días	sáb 7/26/14	dom 8/10/14																	
122	Planta de Tratamiento	15 días	sáb 7/26/14	dom 8/10/14																	
123	Infraestructura Sanitaria	15 días	sáb 7/26/14	dom 8/10/14																	
124	Infraestructura Pluvial	15 días	sáb 7/26/14	dom 8/10/14																	
125	Infraestructura Potable	15 días	sáb 7/26/14	dom 8/10/14																	
126	Infraestructura Electrica	15 días	sáb 7/26/14	dom 8/10/14																	
127	Equipo Cisterna	15 días	sáb 7/26/14	dom 8/10/14																	
128	Alumbrado Publico	15 días	sáb 7/26/14	dom 8/10/14																	
129	Generador Electrico	15 días	sáb 7/26/14	dom 8/10/14																	
130	<b>Fabricacion y Entrega de Materiales</b>	<b>120 días</b>	<b>dom 8/10/14</b>	<b>lun 12/8/14</b>																	
131	Pilotes	30 días	dom 8/10/14	mar 9/9/14																	
132	Acero Estructural (Auditorio)	60 días	jue 10/9/14	lun 12/8/14																	
133	Acero de Refuerzo	30 días	dom 8/10/14	mar 9/9/14																	
134	Bloques de Concreto	30 días	dom 8/10/14	mar 9/9/14																	
135	Acero Estructural (Edificio Danza)	60 días	dom 8/10/14	jue 10/9/14																	
136	Sistema de Aislamiento	30 días	dom 8/10/14	mar 9/9/14																	
137	Puertas y Herrajes	60 días	dom 8/10/14	jue 10/9/14																	
138	Ventanas y Cristalería	120 días	dom 8/10/14	lun 12/8/14																	
139	Acabados de Piso	30 días	dom 8/10/14	mar 9/9/14																	
140	Acabados de Pared	30 días	dom 8/10/14	mar 9/9/14																	
141	Paredes de Yeso	30 días	dom 8/10/14	mar 9/9/14																	
142	Cielo Raso	30 días	dom 8/10/14	mar 9/9/14																	
143	Pintura	30 días	dom 8/10/14	mar 9/9/14																	
144	Tubería y Materiales Sistema Sanitario	30 días	dom 8/10/14	mar 9/9/14																	
145	Tubería y Materiales Sistema Pluvial	30 días	dom 8/10/14	mar 9/9/14																	
146	Tubería y Materiales Sistema Agua Potable	30 días	dom 8/10/14	mar 9/9/14																	
147	Aparatos Sanitarios	30 días	dom 8/10/14	mar 9/9/14																	
148	Accesorios de Bano	30 días	dom 8/10/14	mar 9/9/14																	
149	Equipos y Materiales de A/A	30 días	dom 8/10/14	mar 9/9/14																	
150	Sistema Contra Incendios	30 días	dom 8/10/14	mar 9/9/14																	
151	Tubería y Materiales Sistema Electrico	30 días	dom 8/10/14	mar 9/9/14																	
152	Cableado Electrico, Sistema de Comunicaciones y Alarm:	30 días	dom 8/10/14	mar 9/9/14																	
153	Equipos Electricos	30 días	dom 8/10/14	mar 9/9/14																	
154	Equipo Alarma Contra Incendio	30 días	dom 8/10/14	mar 9/9/14																	
155	Lamparas	30 días	dom 8/10/14	mar 9/9/14																	

Project: PROYECTO CIUDAD DE LAS ART  
ANALISIS DE IMPACTO DE TIEMPO #1A  
Date: mar 6/10/14

Task		Project Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone	
Split		External Tasks		Manual Task		Start-only		Progress	
Milestone		External Milestone		Duration-only		Finish-only		Deadline	
Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks			

Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	noviembre 21		mayo 1		octubre 11		marzo 21		septiembre 1		febrero 11		julio 21		enero 1		
					11/18	2/3	4/21	7/7	9/22	12/8	2/23	5/11	7/27	10/12	12/28	3/15	5/31	8/16	11/1	1/17	
156	Sistema de Elevador	120 días	dom 8/10/14	lun 12/8/14																	
157	Jardinería	14 días	dom 8/10/14	dom 8/24/14																	
158	Marcado de Pavimento y Rotulacion	14 días	dom 8/10/14	dom 8/24/14																	
159	Sistema de Impermeabilizacion	30 días	dom 8/10/14	mar 9/9/14																	
160	Planta de Tratamiento	30 días	dom 8/10/14	mar 9/9/14																	
161	Infraestructura Sanitaria	45 días	dom 8/10/14	mié 9/24/14																	
162	Infraestructura Pluvial	45 días	dom 8/10/14	mié 9/24/14																	
163	Infraestructura Potable	30 días	dom 8/10/14	mar 9/9/14																	
164	Infraestructura Electrica	30 días	dom 8/10/14	mar 9/9/14																	
165	Equipo Cisterna	60 días	dom 8/10/14	jue 10/9/14																	
166	Alumbrado Publico	30 días	dom 8/10/14	mar 9/9/14																	
167	Generador Electrico	90 días	dom 8/10/14	sáb 11/8/14																	
168	<b>Construccion</b>	<b>909.53 días</b>	<b>mié 4/24/13</b>	<b>mar 10/20/15</b>																	
169	<b>Trabajos de Urbanismo</b>	<b>909.13 días</b>	<b>mié 4/24/13</b>	<b>mar 10/20/15</b>																	
170	<b>Demolicion</b>	<b>34 días</b>	<b>mar 6/17/14</b>	<b>lun 7/21/14</b>																	
171	Demolicion - Edificio E	6 días	mar 6/24/14	lun 6/30/14																	
172	Demolicion - Edificio A	10 días	lun 6/30/14	jue 7/10/14																	
173	Demolicion - Muros Existentes	4 días	jue 7/10/14	lun 7/14/14																	
174	Demolicion - Estacionamientos	4 días	lun 7/14/14	vie 7/18/14																	
175	Demolicion - Plaza Interior	3 días	vie 7/18/14	lun 7/21/14																	
176	Demolicion - Edicio F	7 días	mar 6/17/14	mar 6/24/14																	
177	<b>Movimiento de Tierra</b>	<b>50 días</b>	<b>lun 7/21/14</b>	<b>mar 9/9/14</b>																	
178	Movimiento de Tierra - Edificio de Teatro	6 días	dom 8/3/14	sáb 8/9/14																	
179	Movimiento de Tierra - Auditorio	9 días	sáb 8/9/14	lun 8/18/14																	
180	Movimiento de Tierra - Escuela de Musica	9 días	lun 8/18/14	mié 8/27/14																	
181	Movimiento de Tierra - Artes Plasticas	9 días	mié 8/27/14	vie 9/5/14																	
182	Movimiento de Tierra - Estacionamientos	4 días	vie 9/5/14	mar 9/9/14																	
183	Movimiento de Tierra - Edificio de Danza	13 días	lun 7/21/14	dom 8/3/14																	
184	<b>Utilidades</b>	<b>287 días</b>	<b>dom 10/26/14</b>	<b>dom 8/9/15</b>																	
185	<b>Sistema Sanitario</b>	<b>210 días</b>	<b>dom 10/26/14</b>	<b>dom 5/24/15</b>																	
186	Infraestructura Sanitaria (Registros)	30 días	dom 10/26/14	mar 11/25/14																	
187	Planta de Tratamiento (Estructura)	60 días	sáb 1/24/15	mié 3/25/15																	
188	Infraestructura Sanitaria (Tubería)	30 días	dom 10/26/14	mar 11/25/14																	
189	Infraestructura Sanitaria (Fuera de Proyecto)	60 días	mar 11/25/14	sáb 1/24/15																	
190	Planta de Tratamiento (Equipos)	60 días	mié 3/25/15	dom 5/24/15																	
191	<b>Sistema Pluvial</b>	<b>60 días</b>	<b>mar 11/25/14</b>	<b>sáb 1/24/15</b>																	
192	Infraestructura Pluvial (Estructuras)	30 días	mar 11/25/14	jue 12/25/14																	
193	Infraestructura Pluvial (Tubería)	30 días	jue 12/25/14	sáb 1/24/15																	
194	<b>Sistema de Agua Potable</b>	<b>105 días</b>	<b>sáb 1/24/15</b>	<b>sáb 5/9/15</b>																	
195	Infraestructura Potable	45 días	sáb 1/24/15	mar 3/10/15																	
196	Cisterna (Estructura)	30 días	mar 3/10/15	jue 4/9/15																	
197	Cisterna (Equipos)	30 días	jue 4/9/15	sáb 5/9/15																	
198	<b>Sistema Electrico</b>	<b>197 días</b>	<b>sáb 1/24/15</b>	<b>dom 8/9/15</b>																	
199	Infraestructura Electrica (Registros)	30 días	sáb 1/24/15	lun 2/23/15																	
200	Infraestructura Electrica (Tubería Media Tension)	30 días	lun 2/23/15	mié 3/25/15																	
201	Infraestructura Electrica (Tubería Baja Tension)	30 días	mié 3/25/15	vie 4/24/15																	
202	Instalacion de Trasnformadores	14 días	vie 4/24/15	vie 5/8/15																	
203	Cableado eléctrico (Media Tension)	18 días	vie 5/8/15	mar 5/26/15																	
204	Cableado eléctrico (Baja Tension)	16 días	mar 5/26/15	jue 6/11/15																	
205	Infraestructura electrica (Fuera de Proyecto)	45 días	jue 6/11/15	dom 7/26/15																	
206	Base de Concreto para Generador Electrico	10 días	mar 7/7/15	vie 7/17/15																	
207	Instalacion Gereador Electrico	14 días	vie 7/17/15	vie 7/31/15																	

Project: PROYECTO CIUDAD DE LAS ART ANALISIS DE IMPACTO DE TIEMPO #1A Date: mar 6/10/14	Task		Project Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone	
	Split		External Tasks		Manual Task		Start-only		Progress	
	Milestone		External Milestone		Duration-only		Finish-only		Deadline	
	Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks			

Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	noviembre 21		mayo 1		octubre 11		marzo 21		septiembre 1		febrero 11		julio 21		enero 1	
					11/18	2/3	4/21	7/7	9/22	12/8	2/23	5/11	7/27	10/12	12/28	3/15	5/31	8/16	11/1	1/17
208	Conexion Electrica	14 días	dom 7/26/15	dom 8/9/15																
209	Alumbrado	45 días	vie 4/24/15	lun 6/8/15																
210	Instalacion de tuberia de Luminarias Publicas	15 días	vie 4/24/15	sáb 5/9/15																
211	Instalacion de Luminarias Publicas	15 días	dom 5/24/15	lun 6/8/15																
212	Cableado electrico para Luminarias Publicas	15 días	sáb 5/9/15	dom 5/24/15																
213	Terminaciones	105 días	mar 7/7/15	mar 10/20/15																
214	Plaza	45 días	mar 7/21/15	vie 9/4/15																
215	Pavimentos y Estacionamientos	30 días	mar 8/11/15	jue 9/10/15																
216	Encintados	21 días	mar 7/21/15	mar 8/11/15																
217	Marcados de Estacionamientos e Instalacion de Rotulos	15 días	mié 9/30/15	jue 10/15/15																
218	Jardineria	20 días	mié 9/30/15	mar 10/20/15																
219	Nivelacion Final de Terreno	14 días	mar 7/7/15	mar 7/21/15																
220	Aceras	20 días	jue 9/10/15	mié 9/30/15																
221	Trabajos de Urbanizacion	1 día	mié 4/24/13	mié 4/24/13																
222	Edificio de la Escuela de Danzas y Ballet	909.53 días	mié 4/24/13	mar 10/20/15																
223	Trabajos estructurales	250.4 días	mar 9/9/14	dom 5/17/15																
224	Estacionamiento	82 días	mar 9/9/14	dom 11/30/14																
225	Cimientos & Viga Sismica	15 días	mié 9/17/14	jue 10/2/14																
226	Losa de Piso	15 días	jue 10/2/14	vie 10/17/14																
227	Paredes de Hormigon	20 días	vie 10/17/14	jue 11/6/14																
228	Hinca de Pilotes	8 días	mar 9/9/14	mié 9/17/14																
229	Losa Estructural	24 días	jue 11/6/14	dom 11/30/14																
230	Nivel 100	30 días	dom 11/30/14	mar 12/30/14																
231	Columnas de Acero	10 días	dom 11/30/14	mié 12/10/14																
232	Vigas de Acero	10 días	mié 12/10/14	sáb 12/20/14																
233	Techo metalico	5 días	sáb 12/20/14	jue 12/25/14																
234	Concreto sobre techo metalico	5 días	jue 12/25/14	mar 12/30/14																
235	Nivel 200	30 días	mar 12/30/14	jue 1/29/15																
236	Columnas de Acero	10 días	mar 12/30/14	vie 1/9/15																
237	Vigas de Acero	10 días	vie 1/9/15	lun 1/19/15																
238	Techo metalico	5 días	lun 1/19/15	sáb 1/24/15																
239	Concreto sobre techo metalico	5 días	sáb 1/24/15	jue 1/29/15																
240	Nivel 300	30 días	jue 1/29/15	sáb 2/28/15																
241	Columnas de Acero	10 días	jue 1/29/15	dom 2/8/15																
242	Vigas de Acero	10 días	dom 2/8/15	mié 2/18/15																
243	Techo metalico	5 días	mié 2/18/15	lun 2/23/15																
244	Concreto sobre techo metalico	5 días	lun 2/23/15	sáb 2/28/15																
245	Nivel 400	30 días	sáb 2/28/15	lun 3/30/15																
246	Columnas de Acero	10 días	sáb 2/28/15	mar 3/10/15																
247	Vigas de Acero	10 días	mar 3/10/15	vie 3/20/15																
248	Techo metalico	5 días	vie 3/20/15	mié 3/25/15																
249	Concreto sobre techo metalico	5 días	mié 3/25/15	lun 3/30/15																
250	Nivel 500	30 días	lun 3/30/15	mié 4/29/15																
251	Columnas de Acero	10 días	lun 3/30/15	jue 4/9/15																
252	Vigas de Acero	10 días	jue 4/9/15	dom 4/19/15																
253	Techo metalico	5 días	dom 4/19/15	vie 4/24/15																
254	Concreto sobre techo metalico	5 días	vie 4/24/15	mié 4/29/15																
255	Nivel 600	18.4 días	mié 4/29/15	dom 5/17/15																
256	Columnas de Acero	6 días	mié 4/29/15	mar 5/5/15																
257	Vigas de Acero	6 días	mar 5/5/15	lun 5/11/15																
258	Techo metalico	3.2 días	lun 5/11/15	jue 5/14/15																
259	Concreto sobre techo metalico	3.2 días	jue 5/14/15	dom 5/17/15																

Project: PROYECTO CIUDAD DE LAS ART  
ANALISIS DE IMPACTO DE TIEMPO #1A  
Date: mar 6/10/14

Task		Project Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone	
Split		External Tasks		Manual Task		Start-only		Progress	
Milestone		External Milestone		Duration-only		Finish-only		Deadline	
Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks			



Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	noviembre 21		mayo 1		octubre 11		marzo 21		septiembre 1		febrero 11		julio 21		enero 1				
					11/18	2/3	4/21	7/7	9/22	12/8	2/23	5/11	7/27	10/12	12/28	3/15	5/31	8/16	11/1	1/17			
260	<b>Trabajos de Mamposteria</b>	778.33 días	mié 4/24/13	jue 6/11/15																			
261	Estacionamiento	1 día	mié 4/24/13	mié 4/24/13																			
262	<b>Nivel 100</b>	16.8 días	jue 1/29/15	sáb 2/14/15																			
263	Mamposteria	16.8 días	jue 1/29/15	sáb 2/14/15																			
264	<b>Nivel 200</b>	16.8 días	sáb 2/28/15	lun 3/16/15																			
265	Mamposteria	16.8 días	sáb 2/28/15	lun 3/16/15																			
266	<b>Nivel 300</b>	16.8 días	lun 3/30/15	mié 4/15/15																			
267	Mamposteria	16.8 días	lun 3/30/15	mié 4/15/15																			
268	<b>Nivel 400</b>	16.8 días	mié 4/29/15	vie 5/15/15																			
269	Mamposteria	16.8 días	mié 4/29/15	vie 5/15/15																			
270	<b>Nivel 500</b>	16.8 días	dom 5/17/15	mié 6/3/15																			
271	Mamposteria	16.8 días	dom 5/17/15	mié 6/3/15																			
272	<b>Nivel 600</b>	8 días	mié 6/3/15	jue 6/11/15																			
273	Mamposteria	8 días	mié 6/3/15	jue 6/11/15																			
274	<b>Trabajos de Acabados</b>	146.4 días	dom 5/17/15	sáb 10/10/15																			
275	Estacionamiento	5.6 días	dom 5/17/15	sáb 5/23/15																			
276	Marcado de Pavimento y Rotulacion	5.6 días	dom 5/17/15	sáb 5/23/15																			
277	<b>Nivel 100</b>	103.2 días	dom 5/17/15	vie 8/28/15																			
278	Cristaleria y Ventanas	12 días	dom 5/17/15	vie 5/29/15																			
279	Puertas y Herrajes (Exteriores)	4 días	vie 5/29/15	mar 6/2/15																			
280	Paredes de Yeso	24 días	mar 6/2/15	vie 6/26/15																			
281	Puertas y Herrajes (Interiores)	14.4 días	lun 7/20/15	lun 8/3/15																			
282	Cielo Raso	16.8 días	vie 6/26/15	lun 7/13/15																			
283	Acabados de Piso	24 días	vie 6/26/15	lun 7/20/15																			
284	Acabados de Pared (Bano)	11.2 días	lun 7/20/15	vie 7/31/15																			
285	Acessorios de Bano	5.6 días	mar 8/11/15	lun 8/17/15																			
286	Pintura Base & Primera Mano	14.4 días	lun 7/13/15	lun 7/27/15																			
287	Pintura Final	9.6 días	mié 8/19/15	vie 8/28/15																			
288	<b>Nivel 200</b>	103.2 días	vie 5/29/15	mié 9/9/15																			
289	Cristaleria y Ventanas	12 días	vie 5/29/15	mié 6/10/15																			
290	Puertas y Herrajes (Exteriores)	4 días	mié 6/10/15	dom 6/14/15																			
291	Paredes de Yeso	24 días	dom 6/14/15	mié 7/8/15																			
292	Puertas y Herrajes (Interiores)	14.4 días	sáb 8/1/15	sáb 8/15/15																			
293	Cielo Raso	16.8 días	mié 7/8/15	sáb 7/25/15																			
294	Acabados de Piso	24 días	mié 7/8/15	sáb 8/1/15																			
295	Acabados de Pared (Bano)	11.2 días	sáb 8/1/15	mié 8/12/15																			
296	Acessorios de Bano	5.6 días	dom 8/23/15	sáb 8/29/15																			
297	Pintura Base & Primera Mano	14.4 días	sáb 7/25/15	sáb 8/8/15																			
298	Pintura Final	9.6 días	lun 8/31/15	mié 9/9/15																			
299	<b>Nivel 300</b>	103.2 días	mié 6/10/15	lun 9/21/15																			
300	Cristaleria y Ventanas	12 días	mié 6/10/15	lun 6/22/15																			
301	Puertas y Herrajes (Exteriores)	4 días	lun 6/22/15	vie 6/26/15																			
302	Paredes de Yeso	24 días	vie 6/26/15	lun 7/20/15																			
303	Puertas y Herrajes (Interiores)	14.4 días	jue 8/13/15	jue 8/27/15																			
304	Cielo Raso	16.8 días	lun 7/20/15	jue 8/6/15																			
305	Acabados de Piso	24 días	lun 7/20/15	jue 8/13/15																			
306	Acabados de Pared (Bano)	11.2 días	jue 8/13/15	lun 8/24/15																			
307	Acessorios de Bano	5.6 días	vie 9/4/15	jue 9/10/15																			
308	Pintura Base & Primera Mano	14.4 días	jue 8/6/15	jue 8/20/15																			
309	Pintura Final	9.6 días	sáb 9/12/15	lun 9/21/15																			
310	<b>Nivel 400</b>	103.2 días	lun 6/22/15	sáb 10/3/15																			
311	Cristaleria y Ventanas	12 días	lun 6/22/15	sáb 7/4/15																			

Project: PROYECTO CIUDAD DE LAS ART  
ANALISIS DE IMPACTO DE TIEMPO #1A  
Date: mar 6/10/14


Task		Project Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone	
Split		External Tasks		Manual Task		Start-only		Progress	
Milestone		External Milestone		Duration-only		Finish-only		Deadline	
Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks			

Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	noviembre 21		mayo 1		octubre 11		marzo 21		septiembre 1		febrero 11		julio 21		enero 1	
					11/18	2/3	4/21	7/7	9/22	12/8	2/23	5/11	7/27	10/12	12/28	3/15	5/31	8/16	11/1	1/17
312	Puertas y Herrajes (Exteriores)	4 días	sáb 7/4/15	mié 7/8/15																
313	Paredes de Yeso	24 días	mié 7/8/15	sáb 8/1/15																
314	Puertas y Herrajes (Interiores)	14.4 días	mar 8/25/15	mar 9/8/15																
315	Cielo Raso	16.8 días	sáb 8/1/15	mar 8/18/15																
316	Acabados de Piso	24 días	sáb 8/1/15	mar 8/25/15																
317	Acabados de Pared (Bano)	11.2 días	mar 8/25/15	sáb 9/5/15																
318	Acessorios de Bano	5.6 días	mié 9/16/15	mar 9/22/15																
319	Pintura Base & Primera Mano	14.4 días	mar 8/18/15	mar 9/1/15																
320	Pintura Final	9.6 días	jue 9/24/15	sáb 10/3/15																
321	<b>Nivel 500</b>	<b>92 días</b>	<b>sáb 7/4/15</b>	<b>dom 10/4/15</b>																
322	Cristaleria y Ventanas	12 días	sáb 7/4/15	jue 7/16/15																
323	Puertas y Herrajes (Exteriores)	4 días	jue 7/16/15	lun 7/20/15																
324	Paredes de Yeso	24 días	lun 7/20/15	jue 8/13/15																
325	Puertas y Herrajes (Interiores)	14.4 días	dom 9/6/15	dom 9/20/15																
326	Cielo Raso	16.8 días	jue 8/13/15	dom 8/30/15																
327	Acabados de Piso	24 días	jue 8/13/15	dom 9/6/15																
328	Acabados de Pared (Bano)	11.2 días	dom 9/6/15	jue 9/17/15																
329	Acessorios de Bano	5.6 días	lun 9/28/15	dom 10/4/15																
330	Pintura Base & Primera Mano	14.4 días	dom 8/30/15	dom 9/13/15																
331	Pintura Final	9.6 días	jue 9/24/15	dom 10/4/15																
332	<b>Nivel 600</b>	<b>86.4 días</b>	<b>jue 7/16/15</b>	<b>sáb 10/10/15</b>																
333	Cristaleria y Ventanas	8 días	jue 7/16/15	vie 7/24/15																
334	Puertas y Herrajes (Exteriores)	1.6 días	vie 7/24/15	dom 7/26/15																
335	Paredes de Yeso	12 días	dom 7/26/15	vie 8/7/15																
336	Puertas y Herrajes (Interiores)	8 días	mié 8/19/15	jue 8/27/15																
337	Cielo Raso	8 días	vie 8/7/15	sáb 8/15/15																
338	Acabados de Piso	12 días	vie 8/7/15	mié 8/19/15																
339	Acabados de Pared (Bano)	6.4 días	mié 8/19/15	mar 8/25/15																
340	Acessorios de Bano	3.2 días	dom 10/4/15	mié 10/7/15																
341	Pintura Base & Primera Mano	8 días	sáb 8/15/15	dom 8/23/15																
342	Pintura Final	4.8 días	mar 10/6/15	sáb 10/10/15																
343	<b>Trabajos electricos</b>	<b>368.4 días</b>	<b>vie 10/17/14</b>	<b>mar 10/20/15</b>																
344	<b>Estacionamiento</b>	<b>11.2 días</b>	<b>vie 10/17/14</b>	<b>mar 10/28/14</b>																
345	Tuberia Electrica Empotrada (Pared)	11.2 días	vie 10/17/14	mar 10/28/14																
346	<b>Nivel 100</b>	<b>237 días</b>	<b>jue 12/25/14</b>	<b>mié 8/19/15</b>																
347	Tuberia de sistema especiales (Telefono & CCTV)	9.6 días	mié 3/18/15	vie 3/27/15																
348	Tuberia de electrica	14.4 días	mar 3/3/15	mié 3/18/15																
349	Cableado eléctrico	11.2 días	vie 6/26/15	mar 7/7/15																
350	Acessorios de Electricidad y sistema especiales	11.2 días	lun 7/27/15	vie 8/7/15																
351	Lamparas	9.6 días	vie 8/7/15	lun 8/17/15																
352	Equipo de Alarma contra incendio	11.2 días	vie 8/7/15	mié 8/19/15																
353	Tuberia Electrica Empotrada (Piso)	3.2 días	jue 12/25/14	dom 12/28/14																
354	<b>Nivel 200</b>	<b>219 días</b>	<b>sáb 1/24/15</b>	<b>lun 8/31/15</b>																
355	Tuberia de electrica	14.4 días	jue 4/2/15	vie 4/17/15																
356	Tuberia de sistema especiales (Telefono & CCTV)	9.6 días	vie 4/17/15	dom 4/26/15																
357	Cableado eléctrico	11.2 días	mié 7/8/15	dom 7/19/15																
358	Acessorios de Electricidad y sistema especiales	11.2 días	sáb 8/8/15	mié 8/19/15																
359	Lamparas	9.6 días	mié 8/19/15	sáb 8/29/15																
360	Equipo de Alarma contra incendio	11.2 días	mié 8/19/15	lun 8/31/15																
361	Tuberia Electrica Empotrada (Piso)	3.2 días	sáb 1/24/15	mar 1/27/15																
362	<b>Nivel 300</b>	<b>201 días</b>	<b>lun 2/23/15</b>	<b>sáb 9/12/15</b>																
363	Tuberia de electrica	14.4 días	sáb 5/2/15	dom 5/17/15																

Project: PROYECTO CIUDAD DE LAS ART  
ANALISIS DE IMPACTO DE TIEMPO #1A  
Date: mar 6/10/14

Task		Project Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone	
Split		External Tasks		Manual Task		Start-only		Progress	
Milestone		External Milestone		Duration-only		Finish-only		Deadline	
Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks			

Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	noviembre 21		mayo 1		octubre 11		marzo 21		septiembre 1		febrero 11		julio 21		enero 1	
					11/18	2/3	4/21	7/7	9/22	12/8	2/23	5/11	7/27	10/12	12/28	3/15	5/31	8/16	11/1	1/17
364	Tubería de sistema especiales (Telefono & CCTV)	9.6 días	dom 5/17/15	mar 5/26/15																
365	Cableado eléctrico	11.2 días	lun 7/20/15	vie 7/31/15																
366	Accesorios de Electricidad y sistema especiales	11.2 días	jue 8/20/15	lun 8/31/15																
367	Lamparas	9.6 días	lun 8/31/15	jue 9/10/15																
368	Equipo de Alarma contra incendio	11.2 días	lun 8/31/15	sáb 9/12/15																
369	Tubería Eléctrica Empotrada (Piso)	3.2 días	lun 2/23/15	jue 2/26/15																
370	<b>Nivel 400</b>	<b>183 días</b>	<b>mié 3/25/15</b>	<b>jue 9/24/15</b>																
371	Tubería de eléctrica	14.4 días	lun 6/1/15	mar 6/16/15																
372	Tubería de sistema especiales (Telefono & CCTV)	9.6 días	mar 6/16/15	jue 6/25/15																
373	Cableado eléctrico	11.2 días	sáb 8/1/15	mié 8/12/15																
374	Accesorios de Electricidad y sistema especiales	11.2 días	mar 9/1/15	sáb 9/12/15																
375	Lamparas	9.6 días	sáb 9/12/15	mar 9/22/15																
376	Equipo de Alarma contra incendio	11.2 días	sáb 9/12/15	jue 9/24/15																
377	Tubería Eléctrica Empotrada (Piso)	3.2 días	mié 3/25/15	sáb 3/28/15																
378	<b>Nivel 500</b>	<b>174.6 días</b>	<b>vie 4/24/15</b>	<b>jue 10/15/15</b>																
379	Tubería de eléctrica	14.4 días	sáb 6/20/15	sáb 7/4/15																
380	Tubería de sistema especiales (Telefono & CCTV)	9.6 días	sáb 7/4/15	mar 7/14/15																
381	Cableado eléctrico	11.2 días	jue 8/13/15	lun 8/24/15																
382	Accesorios de Electricidad y sistema especiales	11.2 días	dom 9/13/15	jue 9/24/15																
383	Lamparas	9.6 días	mar 10/6/15	jue 10/15/15																
384	Equipo de Alarma contra incendio	11.2 días	jue 9/24/15	mar 10/6/15																
385	Tubería Eléctrica Empotrada (Piso)	3.2 días	vie 4/24/15	lun 4/27/15																
386	<b>Nivel 600</b>	<b>159.2 días</b>	<b>jue 5/14/15</b>	<b>mar 10/20/15</b>																
387	Tubería de eléctrica	8 días	sáb 7/4/15	dom 7/12/15																
388	Tubería de sistema especiales (Telefono & CCTV)	4.8 días	dom 7/12/15	vie 7/17/15																
389	Cableado eléctrico	5.6 días	lun 8/24/15	dom 8/30/15																
390	Accesorios de Electricidad y sistema especiales	5.6 días	jue 9/24/15	mié 9/30/15																
391	Lamparas	4.8 días	jue 10/15/15	mar 10/20/15																
392	Equipo de Alarma contra incendio	5.6 días	mié 9/30/15	mar 10/6/15																
393	Tubería Eléctrica Empotrada (Piso)	1.6 días	jue 5/14/15	vie 5/15/15																
394	<b>Trabajos plomería/mecánica</b>	<b>361.8 días</b>	<b>jue 10/2/14</b>	<b>lun 9/28/15</b>																
395	<b>Estacionamiento</b>	<b>64.6 días</b>	<b>jue 10/2/14</b>	<b>vie 12/5/14</b>																
396	Tubería de control contra fuego	5.6 días	dom 11/30/14	vie 12/5/14																
397	Tubería Plomería Empotrada (Piso)	11.2 días	jue 10/2/14	lun 10/13/14																
398	Tubería Plomería Empotrada (Pared)	11.2 días	vie 10/17/14	mar 10/28/14																
399	<b>Nivel 100</b>	<b>178 días</b>	<b>sáb 2/14/15</b>	<b>mar 8/11/15</b>																
400	Aparatos Sanitarios	11.2 días	vie 7/31/15	mar 8/11/15																
401	Rociadores de Fuego	9.6 días	lun 7/13/15	mié 7/22/15																
402	Dispositivos de AA	9.6 días	lun 7/13/15	mié 7/22/15																
403	Ductos de AA	16.8 días	sáb 2/14/15	mar 3/3/15																
404	Tubería de plomería	16.8 días	sáb 2/14/15	mar 3/3/15																
405	Tubería de control contra fuego	14.4 días	mar 3/3/15	mié 3/18/15																
406	<b>Nivel 200</b>	<b>160 días</b>	<b>lun 3/16/15</b>	<b>dom 8/23/15</b>																
407	Ductos de AA	16.8 días	lun 3/16/15	jue 4/2/15																
408	Tubería de plomería	16.8 días	lun 3/16/15	jue 4/2/15																
409	Tubería de control contra fuego	14.4 días	jue 4/2/15	vie 4/17/15																
410	Aparatos Sanitarios	11.2 días	mié 8/12/15	dom 8/23/15																
411	Rociadores de Fuego	9.6 días	sáb 7/25/15	lun 8/3/15																
412	Dispositivos de AA	9.6 días	sáb 7/25/15	lun 8/3/15																
413	<b>Nivel 300</b>	<b>142 días</b>	<b>mié 4/15/15</b>	<b>vie 9/4/15</b>																
414	Ductos de AA	16.8 días	mié 4/15/15	sáb 5/2/15																
415	Tubería de plomería	16.8 días	mié 4/15/15	sáb 5/2/15																

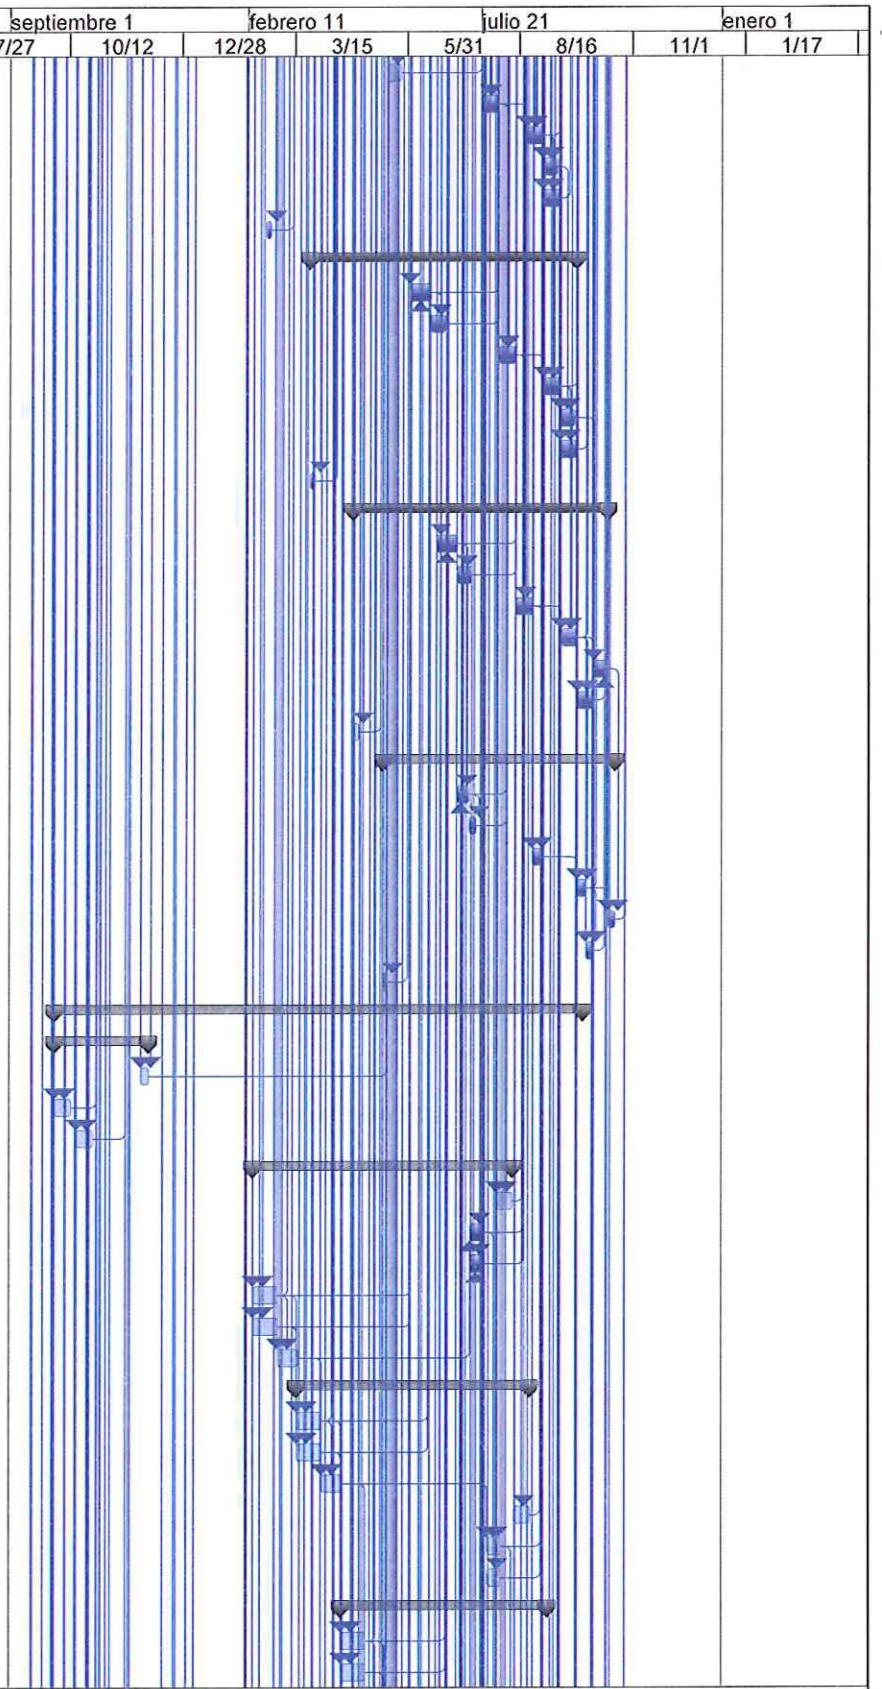

Project: PROYECTO CIUDAD DE LAS ART ANALISIS DE IMPACTO DE TIEMPO #1A  
Date: mar 6/10/14

Task		Project Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone	
Split		External Tasks		Manual Task		Start-only		Progress	
Milestone		External Milestone		Duration-only		Finish-only		Deadline	
Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks			

Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	noviembre 21		mayo 1		octubre 11		marzo 21		septiembre 1		febrero 11		julio 21		enero 1	
					11/18	2/3	4/21	7/7	9/22	12/8	2/23	5/11	7/27	10/12	12/28	3/15	5/31	8/16	11/1	1/17
416	Tubería de control contra fuego	14.4 días	sáb 5/2/15	dom 5/17/15																
417	Aparatos Sanitarios	11.2 días	lun 8/24/15	vie 9/4/15																
418	Rociadores de Fuego	9.6 días	jue 8/6/15	sáb 8/15/15																
419	Dispositivos de AA	9.6 días	jue 8/6/15	sáb 8/15/15																
420	<b>Nivel 400</b>	<b>124 días</b>	<b>vie 5/15/15</b>	<b>mié 9/16/15</b>																
421	Ductos de AA	16.8 días	vie 5/15/15	lun 6/1/15																
422	Tubería de plomería	16.8 días	vie 5/15/15	lun 6/1/15																
423	Tubería de control contra fuego	14.4 días	lun 6/1/15	mar 6/16/15																
424	Rociadores de Fuego	9.6 días	mar 8/18/15	jue 8/27/15																
425	Aparatos Sanitarios	11.2 días	sáb 9/5/15	mié 9/16/15																
426	Dispositivos de AA	9.6 días	mar 8/18/15	jue 8/27/15																
427	<b>Nivel 500</b>	<b>117.6 días</b>	<b>mié 6/3/15</b>	<b>lun 9/28/15</b>																
428	Ductos de AA	16.8 días	mié 6/3/15	sáb 6/20/15																
429	Tubería de plomería	16.8 días	mié 6/3/15	sáb 6/20/15																
430	Tubería de control contra fuego	14.4 días	sáb 6/20/15	sáb 7/4/15																
431	Aparatos Sanitarios	11.2 días	jue 9/17/15	lun 9/28/15																
432	Rociadores de Fuego	9.6 días	dom 8/30/15	mar 9/8/15																
433	Dispositivos de AA	9.6 días	dom 8/30/15	mar 9/8/15																
434	<b>Nivel 600</b>	<b>85.6 días</b>	<b>sáb 6/20/15</b>	<b>dom 9/13/15</b>																
435	Ductos de AA	9.6 días	sáb 6/20/15	lun 6/29/15																
436	Tubería de plomería	9.6 días	sáb 6/20/15	lun 6/29/15																
437	Tubería de control contra fuego	8 días	sáb 7/4/15	dom 7/12/15																
438	Aparatos Sanitarios	5.6 días	mar 8/25/15	lun 8/31/15																
439	Rociadores de Fuego	4.8 días	mar 9/8/15	dom 9/13/15																
440	Dispositivos de AA	4.8 días	sáb 8/15/15	mié 8/19/15																
441	<b>Trabajo exterior/techo</b>	<b>106.2 días</b>	<b>jue 5/14/15</b>	<b>vie 8/28/15</b>																
442	Sistema de Elevador (3 cu)	40 días	jue 5/14/15	mar 6/23/15																
443	Maquinas de AA	11.2 días	lun 6/29/15	vie 7/10/15																
444	Sistema de Impermeabilización	24 días	dom 5/17/15	mié 6/10/15																
445	Pintura Base & Primera Mano (Exterior)	21 días	vie 7/24/15	vie 8/14/15																
446	Pintura Final (Exterior)	14 días	vie 8/14/15	vie 8/28/15																
447	<b>Escuela de Teatro/Musica</b>	<b>909.13 días</b>	<b>mié 4/24/13</b>	<b>mar 10/20/15</b>																
448	<b>Trabajos estructurales</b>	<b>191 días</b>	<b>mié 9/17/14</b>	<b>vie 3/27/15</b>																
449	<b>Nivel 100</b>	<b>86 días</b>	<b>mié 9/17/14</b>	<b>vie 12/12/14</b>																
450	Hinca de Pilotes	14 días	mié 9/17/14	mié 10/1/14																
451	Cimientos & Viga Sismica	14 días	jue 10/2/14	jue 10/16/14																
452	Losa de Piso	14 días	vie 10/17/14	vie 10/31/14																
453	Columnas de Concreto	18 días	vie 10/31/14	mar 11/18/14																
454	Losa Estructural	24 días	mar 11/18/14	vie 12/12/14																
455	<b>Nivel 300</b>	<b>30 días</b>	<b>vie 12/12/14</b>	<b>dom 1/11/15</b>																
456	Columnas de Concreto	12 días	vie 12/12/14	mié 12/24/14																
457	Losa Estructural	18 días	mié 12/24/14	dom 1/11/15																
458	<b>Nivel 400</b>	<b>30 días</b>	<b>dom 1/11/15</b>	<b>mar 2/10/15</b>																
459	Columnas de Concreto	12 días	dom 1/11/15	vie 1/23/15																
460	Losa Estructural	18 días	vie 1/23/15	mar 2/10/15																
461	<b>Nivel 500</b>	<b>30 días</b>	<b>mar 2/10/15</b>	<b>jue 3/12/15</b>																
462	Columnas de Concreto	12 días	mar 2/10/15	dom 2/22/15																
463	Losa Estructural	18 días	dom 2/22/15	jue 3/12/15																
464	<b>Nivel 600</b>	<b>15 días</b>	<b>jue 3/12/15</b>	<b>vie 3/27/15</b>																
465	Columnas de Concreto	5 días	jue 3/12/15	mar 3/17/15																
466	Losa Estructural	10 días	mar 3/17/15	vie 3/27/15																
467	<b>Trabajos de Mampostería</b>	<b>747.13 días</b>	<b>mié 4/24/13</b>	<b>lun 5/11/15</b>																

Project: PROYECTO CIUDAD DE LAS ART  
ANÁLISIS DE IMPACTO DE TIEMPO #1A  
Date: mar 6/10/14

Task		Project Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone	
Split		External Tasks		Manual Task		Start-only		Progress	
Milestone		External Milestone		Duration-only		Finish-only		Deadline	
Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks			

Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	noviembre 21		mayo 1		octubre 11		marzo 21		septiembre 1		febrero 11		julio 21		enero 1'	
					11/18	2/3	4/21	7/7	9/22	12/8	2/23	5/11	7/27	10/12	12/28	3/15	5/31	8/16	11/1	1/17
468	Nivel 100	1 día	mié 4/24/13	mié 4/24/13																
469	Nivel 300	25 días	mar 2/10/15	sáb 3/7/15																
470	Mampostería	25 días	mar 2/10/15	sáb 3/7/15																
471	Nivel 400	25 días	jue 3/12/15	lun 4/6/15																
472	Mampostería	25 días	jue 3/12/15	lun 4/6/15																
473	Nivel 500	25 días	lun 4/6/15	vie 5/1/15																
474	Mampostería	25 días	lun 4/6/15	vie 5/1/15																
475	Nivel 600	10 días	vie 5/1/15	lun 5/11/15																
476	Mampostería	10 días	vie 5/1/15	lun 5/11/15																
477	Trabajos de Acabados	899.13 días	mié 4/24/13	sáb 10/10/15																
478	Nivel 100	1 día	mié 4/24/13	mié 4/24/13																
479	Nivel 300	161 días	vie 3/27/15	vie 9/4/15																
480	Cristalería y Ventanas	20 días	vie 3/27/15	jue 4/16/15																
481	Puertas y Herrajes (Exteriores)	8 días	jue 4/16/15	vie 4/24/15																
482	Paredes de Yeso	30 días	vie 4/24/15	dom 5/24/15																
483	Puertas y Herrajes (Interiores)	25 días	dom 6/28/15	jue 7/23/15																
484	Cielo Raso	30 días	dom 5/24/15	mar 6/23/15																
485	Acabados de Piso	35 días	dom 5/24/15	dom 6/28/15																
486	Acabados de Pared (Bano)	18 días	dom 6/28/15	jue 7/16/15																
487	Acessorios de Bano	10 días	jue 7/30/15	dom 8/9/15																
488	Pintura Base & Primera Mano	21 días	mar 6/23/15	mar 7/14/15																
489	Pintura Final	16 días	mié 8/19/15	vie 9/4/15																
490	Nivel 400	161 días	jue 4/16/15	jue 9/24/15																
491	Cristalería y Ventanas	20 días	jue 4/16/15	mié 5/6/15																
492	Puertas y Herrajes (Exteriores)	8 días	mié 5/6/15	jue 5/14/15																
493	Paredes de Yeso	30 días	jue 5/14/15	sáb 6/13/15																
494	Puertas y Herrajes (Interiores)	25 días	sáb 7/18/15	mié 8/12/15																
495	Cielo Raso	30 días	sáb 6/13/15	lun 7/13/15																
496	Acabados de Piso	35 días	sáb 6/13/15	sáb 7/18/15																
497	Acabados de Pared (Bano)	18 días	sáb 7/18/15	mié 8/5/15																
498	Acessorios de Bano	10 días	mié 8/19/15	sáb 8/29/15																
499	Pintura Base & Primera Mano	21 días	lun 7/13/15	lun 8/3/15																
500	Pintura Final	16 días	mar 9/8/15	jue 9/24/15																
501	Nivel 500	143 días	mié 5/6/15	sáb 9/26/15																
502	Cristalería y Ventanas	20 días	mié 5/6/15	mar 5/26/15																
503	Puertas y Herrajes (Exteriores)	8 días	mar 5/26/15	mié 6/3/15																
504	Paredes de Yeso	30 días	mié 6/3/15	vie 7/3/15																
505	Puertas y Herrajes (Interiores)	25 días	vie 8/7/15	mar 9/1/15																
506	Cielo Raso	30 días	vie 7/3/15	dom 8/2/15																
507	Acabados de Piso	35 días	vie 7/3/15	vie 8/7/15																
508	Acabados de Pared (Bano)	18 días	vie 8/7/15	mar 8/25/15																
509	Acessorios de Bano	10 días	mar 9/8/15	vie 9/18/15																
510	Pintura Base & Primera Mano	21 días	dom 8/2/15	dom 8/23/15																
511	Pintura Final	16 días	jue 9/10/15	sáb 9/26/15																
512	Nivel 600	137 días	mar 5/26/15	sáb 10/10/15																
513	Cristalería y Ventanas	18 días	mar 5/26/15	sáb 6/13/15																
514	Puertas y Herrajes (Exteriores)	5 días	sáb 6/13/15	jue 6/18/15																
515	Paredes de Yeso	20 días	jue 6/18/15	mié 7/8/15																
516	Puertas y Herrajes (Interiores)	15 días	mar 7/28/15	mié 8/12/15																
517	Cielo Raso	20 días	mié 7/8/15	mar 7/28/15																
518	Acabados de Piso	20 días	mié 7/8/15	mar 7/28/15																
519	Acabados de Pared (Bano)	10 días	mar 7/28/15	vie 8/7/15																

Project: PROYECTO CIUDAD DE LAS ART  
ANALISIS DE IMPACTO DE TIEMPO #1A  
Date: mar 6/10/14

Task		Project Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone	
Split		External Tasks		Manual Task		Start-only		Progress	
Milestone		External Milestone		Duration-only		Finish-only		Deadline	
Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks			

Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	noviembre 21		mayo 1		octubre 11		marzo 21		septiembre 1		febrero 11		julio 21		enero 1	
					11/18	2/3	4/21	7/7	9/22	12/8	2/23	5/11	7/27	10/12	12/28	3/15	5/31	8/16	11/1	1/17
520	Acessorios de Bano	7 días	vie 9/18/15	vie 9/25/15																
521	Pintura Base & Primera Mano	15 días	mar 7/28/15	mié 8/12/15																
522	Pintura Final	10 días	mié 9/30/15	sáb 10/10/15																
523	<b>Trabajos electricos</b>	<b>909.13 días</b>	<b>mié 4/24/13</b>	<b>mar 10/20/15</b>																
524	Nivel 100	1 día	mié 4/24/13	mié 4/24/13																
525	Nivel 300	238 días	mié 12/24/14	mié 8/19/15																
526	Equipo de Alarma contra incendio	18 días	sáb 8/1/15	mié 8/19/15																
527	Tuberia Electrica Empotrada (Piso)	4 días	mié 12/24/14	dom 12/28/14																
528	Tuberia de electrica	20 días	sáb 3/28/15	vie 4/17/15																
529	Tuberia de sistema especiales (Telefono & CCTV)	18 días	vie 4/17/15	mar 5/5/15																
530	Cableado electrico	18 días	dom 5/24/15	jue 6/11/15																
531	Accesorios de Electricidad y sistema especiales	18 días	mar 7/14/15	sáb 8/1/15																
532	Lamparas	15 días	sáb 8/1/15	dom 8/16/15																
533	Nivel 400	228 días	vie 1/23/15	mar 9/8/15																
534	Equipo de Alarma contra incendio	18 días	vie 8/21/15	mar 9/8/15																
535	Tuberia Electrica Empotrada (Piso)	4 días	vie 1/23/15	mar 1/27/15																
536	Tuberia de electrica	20 días	lun 4/27/15	dom 5/17/15																
537	Tuberia de sistema especiales (Telefono & CCTV)	18 días	dom 5/17/15	jue 6/4/15																
538	Cableado electrico	18 días	sáb 6/13/15	mié 7/1/15																
539	Accesorios de Electricidad y sistema especiales	18 días	lun 8/3/15	vie 8/21/15																
540	Lamparas	15 días	vie 8/21/15	sáb 9/5/15																
541	Nivel 500	233 días	dom 2/22/15	mar 10/13/15																
542	Equipo de Alarma contra incendio	18 días	jue 9/10/15	lun 9/28/15																
543	Tuberia Electrica Empotrada (Piso)	4 días	dom 2/22/15	jue 2/26/15																
544	Tuberia de electrica	20 días	vie 5/22/15	jue 6/11/15																
545	Tuberia de sistema especiales (Telefono & CCTV)	18 días	jue 6/11/15	lun 6/29/15																
546	Cableado electrico	18 días	vie 7/3/15	mar 7/21/15																
547	Accesorios de Electricidad y sistema especiales	18 días	dom 8/23/15	jue 9/10/15																
548	Lamparas	15 días	lun 9/28/15	mar 10/13/15																
549	Nivel 600	217 días	mar 3/17/15	mar 10/20/15																
550	Accesorios de Electricidad y sistema especiales	10 días	jue 9/10/15	dom 9/20/15																
551	Lamparas	7 días	mar 10/13/15	mar 10/20/15																
552	Equipo de Alarma contra incendio	10 días	dom 9/20/15	mié 9/30/15																
553	Tuberia Electrica Empotrada (Piso)	2 días	mar 3/17/15	jue 3/19/15																
554	Tuberia de electrica	12 días	jue 6/11/15	mar 6/23/15																
555	Tuberia de sistema especiales (Telefono & CCTV)	10 días	mar 6/23/15	vie 7/3/15																
556	Cableado electrico	10 días	mar 7/21/15	vie 7/31/15																
557	<b>Trabajos plomeria/mecanica</b>	<b>327 días</b>	<b>jue 10/16/14</b>	<b>mar 9/8/15</b>																
558	Nivel 100	29 días	jue 10/16/14	vie 11/14/14																
559	Tuberia Plomeria Empotrada (Piso)	14 días	jue 10/16/14	jue 10/30/14																
560	Tuberia Plomeria Empotrada (Pared)	14 días	vie 10/31/14	vie 11/14/14																
561	Nivel 300	145 días	sáb 3/7/15	jue 7/30/15																
562	Ductos de AA	21 días	sáb 3/7/15	sáb 3/28/15																
563	Tuberia de plomeria	21 días	sáb 3/7/15	sáb 3/28/15																
564	Tuberia de control contra fuego	18 días	sáb 3/28/15	mié 4/15/15																
565	Aparatos Sanitarios	14 días	jue 7/16/15	jue 7/30/15																
566	Rociadores de Fuego	12 días	mar 6/23/15	dom 7/5/15																
567	Dispositivos de AA	12 días	mar 6/23/15	dom 7/5/15																
568	Nivel 400	135 días	lun 4/6/15	mié 8/19/15																
569	Ductos de AA	21 días	lun 4/6/15	lun 4/27/15																
570	Tuberia de plomeria	21 días	lun 4/6/15	lun 4/27/15																
571	Tuberia de control contra fuego	18 días	lun 4/27/15	vie 5/15/15																

Project: PROYECTO CIUDAD DE LAS ART  
ANALISIS DE IMPACTO DE TIEMPO #1A  
Date: mar 6/10/14

Task		Project Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone	
Split		External Tasks		Manual Task		Start-only		Progress	
Milestone		External Milestone		Duration-only		Finish-only		Deadline	
Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks			

Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	noviembre 21		mayo 1		octubre 11		marzo 21		septiembre 1		febrero 11		julio 21		enero 1	
					11/18	2/3	4/21	7/7	9/22	12/8	2/23	5/11	7/27	10/12	12/28	3/15	5/31	8/16	11/1	1/17
572	Aparatos Sanitarios	14 días	mié 8/5/15	mié 8/19/15																
573	Rociadores de Fuego	12 días	lun 7/13/15	sáb 7/25/15																
574	Dispositivos de AA	12 días	lun 7/13/15	sáb 7/25/15																
575	<b>Nivel 500</b>	<b>130 días</b>	<b>vie 5/1/15</b>	<b>mar 9/8/15</b>																
576	Ductos de AA	21 días	vie 5/1/15	vie 5/22/15																
577	Tubería de plomería	21 días	vie 5/1/15	vie 5/22/15																
578	Tubería de control contra fuego	18 días	vie 5/22/15	mar 6/9/15																
579	Aparatos Sanitarios	14 días	mar 8/25/15	mar 9/8/15																
580	Rociadores de Fuego	12 días	dom 8/2/15	vie 8/14/15																
581	Dispositivos de AA	12 días	dom 8/2/15	vie 8/14/15																
582	<b>Nivel 600</b>	<b>90 días</b>	<b>vie 5/22/15</b>	<b>jue 8/20/15</b>																
583	Aparatos Sanitarios	7 días	vie 8/7/15	vie 8/14/15																
584	Rociadores de Fuego	6 días	vie 8/14/15	jue 8/20/15																
585	Dispositivos de AA	6 días	mar 7/28/15	lun 8/3/15																
586	Ductos de AA	12 días	vie 5/22/15	mié 6/3/15																
587	Tubería de plomería	12 días	vie 5/22/15	mié 6/3/15																
588	Tubería de control contra fuego	10 días	mar 6/9/15	vie 6/19/15																
589	<b>Trabajo exterior/techo</b>	<b>113 días</b>	<b>vie 3/27/15</b>	<b>sáb 7/18/15</b>																
590	Sistema de Impermeabilizacion	35 días	vie 3/27/15	vie 5/1/15																
591	Sistema de Elevador (2 cu)	40 días	vie 3/27/15	mié 5/6/15																
592	Maquinas de AA	14 días	mié 6/3/15	mié 6/17/15																
593	Pintura Base & Primera Mano (Exterior)	21 días	sáb 6/13/15	sáb 7/4/15																
594	Pintura Final (Exterior)	14 días	sáb 7/4/15	sáb 7/18/15																
595	<b>Auditorio</b>	<b>800.73 días</b>	<b>mié 4/24/13</b>	<b>vie 7/3/15</b>																
596	<b>Trabajos estructurales</b>	<b>136.8 días</b>	<b>mié 10/1/14</b>	<b>sáb 2/14/15</b>																
597	<b>Almacen &amp; Orquesta</b>	<b>69.6 días</b>	<b>mié 10/1/14</b>	<b>mar 12/9/14</b>																
598	Cimientos & Viga Sismica	16.8 días	jue 10/9/14	sáb 10/25/14																
599	Losa de Piso (Sotano)	7 días	jue 10/30/14	jue 11/6/14																
600	Paredes de Hormigon (Sotano)	10 días	vie 11/7/14	lun 11/17/14																
601	Hinca de Pilotes	8 días	mié 10/1/14	jue 10/9/14																
602	Losa Estructural/Losa sobre Tierra	22.4 días	lun 11/17/14	mar 12/9/14																
603	<b>Nivel 100</b>	<b>33.6 días</b>	<b>mar 12/9/14</b>	<b>lun 1/12/15</b>																
604	Columnas de Acero	11.2 días	mar 12/9/14	sáb 12/20/14																
605	Vigas de Acero	11.2 días	sáb 12/20/14	jue 1/1/15																
606	Techo metalico	5.6 días	jue 1/1/15	mar 1/6/15																
607	Concreto sobre techo metalico	5.6 días	mar 1/6/15	lun 1/12/15																
608	<b>Nivel 200</b>	<b>33.6 días</b>	<b>lun 1/12/15</b>	<b>sáb 2/14/15</b>																
609	Columnas de Acero	11.2 días	lun 1/12/15	vie 1/23/15																
610	Vigas de Acero	11.2 días	vie 1/23/15	mar 2/3/15																
611	Techo metalico	5.6 días	mar 2/3/15	lun 2/9/15																
612	Concreto sobre techo metalico	5.6 días	lun 2/9/15	sáb 2/14/15																
613	<b>Trabajos de Mampostería</b>	<b>691.93 días</b>	<b>mié 4/24/13</b>	<b>lun 3/16/15</b>																
614	Almacen & Orquesta	1 día	mié 4/24/13	mié 4/24/13																
615	<b>Nivel 100</b>	<b>15 días</b>	<b>sáb 2/14/15</b>	<b>dom 3/1/15</b>																
616	Mampostería	15 días	sáb 2/14/15	dom 3/1/15																
617	<b>Nivel 200</b>	<b>15 días</b>	<b>dom 3/1/15</b>	<b>lun 3/16/15</b>																
618	Mampostería	15 días	dom 3/1/15	lun 3/16/15																
619	<b>Trabajos de Acabados</b>	<b>797.73 días</b>	<b>mié 4/24/13</b>	<b>mar 6/30/15</b>																
620	Almacen & Orquesta	1 día	mié 4/24/13	mié 4/24/13																
621	<b>Nivel 100</b>	<b>119 días</b>	<b>sáb 2/14/15</b>	<b>sáb 6/13/15</b>																
622	Cristalería y Ventanas	14.4 días	sáb 2/14/15	dom 3/1/15																
623	Puertas y Herrajes (Exteriores)	4 días	dom 3/1/15	jue 3/5/15																

Project: PROYECTO CIUDAD DE LAS ART ANALISIS DE IMPACTO DE TIEMPO #1A  
Date: mar 6/10/14

Task		Project Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone	
Split		External Tasks		Manual Task		Start-only		Progress	
Milestone		External Milestone		Duration-only		Finish-only		Deadline	
Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks			

Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	noviembre 21		mayo 1		octubre 11		marzo 21		septiembre 1		febrero 11		julio 21		enero 1		
					11/18	2/3	4/21	7/7	9/22	12/8	2/23	5/11	7/27	10/12	12/28	3/15	5/31	8/16	11/1	1/17	
624	Paredes de Yeso	24 días	mié 3/18/15	sáb 4/11/15																	
625	Puertas y Herrerajes (Interiores)	14.4 días	mar 5/5/15	mié 5/20/15																	
626	Cielo Raso	16.8 días	sáb 4/11/15	mar 4/28/15																	
627	Acabados de Piso	24 días	sáb 4/11/15	mar 5/5/15																	
628	Acabados de Pared (Bano)	11.2 días	mar 5/5/15	sáb 5/16/15																	
629	Accesorios de Bano	5.6 días	jue 5/28/15	mar 6/2/15																	
630	Pintura Base & Primera Mano	14.4 días	mar 4/28/15	mar 5/12/15																	
631	Pintura Final	9.6 días	jue 6/4/15	sáb 6/13/15																	
632	<b>Nivel 200</b>	<b>121.4 días</b>	<b>dom 3/1/15</b>	<b>mar 6/30/15</b>																	
633	Cristaleria y Ventanas	14.4 días	dom 3/1/15	dom 3/15/15																	
634	Puertas y Herrerajes (Exteriores)	4 días	dom 3/15/15	jue 3/19/15																	
635	Paredes de Yeso	24 días	sáb 4/4/15	mar 4/28/15																	
636	Puertas y Herrerajes (Interiores)	14.4 días	vie 5/22/15	vie 6/5/15																	
637	Cielo Raso	16.8 días	mar 4/28/15	vie 5/15/15																	
638	Acabados de Piso	24 días	mar 4/28/15	vie 5/22/15																	
639	Acabados de Pared (Bano)	11.2 días	vie 5/22/15	mar 6/2/15																	
640	Accesorios de Bano	5.6 días	sáb 6/13/15	vie 6/19/15																	
641	Pintura Base & Primera Mano	14.4 días	vie 5/15/15	vie 5/29/15																	
642	Pintura Final	9.6 días	dom 6/21/15	mar 6/30/15																	
643	<b>Trabajos electricos</b>	<b>227 días</b>	<b>jue 11/6/14</b>	<b>dom 6/21/15</b>																	
644	<b>Almacen &amp; Orquesta</b>	<b>11.2 días</b>	<b>jue 11/6/14</b>	<b>lun 11/17/14</b>																	
645	Tuberia Electrica Empotrada (Pared)	11.2 días	jue 11/6/14	lun 11/17/14																	
646	<b>Nivel 100</b>	<b>148.6 días</b>	<b>mar 1/6/15</b>	<b>jue 6/4/15</b>																	
647	Tuberia de sistema especiales (Telefono & CCTV)	9.6 días	jue 4/2/15	sáb 4/11/15																	
648	Tuberia de electrica	14.4 días	mié 3/18/15	jue 4/2/15																	
649	Cableado electrico	11.2 días	sáb 4/11/15	mié 4/22/15																	
650	Accesorios de Electricidad y sistema especiales	11.2 días	mar 5/12/15	dom 5/24/15																	
651	Lamparas	9.6 días	dom 5/24/15	mar 6/2/15																	
652	Equipo de Alarma contra incendio	11.2 días	dom 5/24/15	jue 6/4/15																	
653	Tuberia Electrica Empotrada (Piso)	3.2 días	mar 1/6/15	vie 1/9/15																	
654	<b>Nivel 200</b>	<b>131.8 días</b>	<b>lun 2/9/15</b>	<b>dom 6/21/15</b>																	
655	Tuberia de electrica	14.4 días	sáb 4/4/15	sáb 4/18/15																	
656	Tuberia de sistema especiales (Telefono & CCTV)	9.6 días	sáb 4/18/15	mar 4/28/15																	
657	Cableado electrico	11.2 días	mar 4/28/15	sáb 5/9/15																	
658	Accesorios de Electricidad y sistema especiales	11.2 días	vie 5/29/15	mar 6/9/15																	
659	Lamparas	9.6 días	mar 6/9/15	vie 6/19/15																	
660	Equipo de Alarma contra incendio	11.2 días	mar 6/9/15	dom 6/21/15																	
661	Tuberia Electrica Empotrada (Piso)	3.2 días	lun 2/9/15	jue 2/12/15																	
662	<b>Trabajos plomeria/mecanica</b>	<b>231 días</b>	<b>sáb 10/25/14</b>	<b>sáb 6/13/15</b>																	
663	<b>Almacen &amp; Orquesta</b>	<b>22.4 días</b>	<b>sáb 10/25/14</b>	<b>lun 11/17/14</b>																	
664	Tuberia Plomeria Empotrada (Piso)	11.2 días	sáb 10/25/14	jue 11/6/14																	
665	Tuberia Plomeria Empotrada (Pared)	11.2 días	jue 11/6/14	lun 11/17/14																	
666	<b>Nivel 100</b>	<b>87.2 días</b>	<b>dom 3/1/15</b>	<b>jue 5/28/15</b>																	
667	Aparatos Sanitarios	11.2 días	sáb 5/16/15	jue 5/28/15																	
668	Rociadores de Fuego	9.6 días	mar 4/28/15	vie 5/8/15																	
669	Dispositivos de AA	9.6 días	mar 4/28/15	vie 5/8/15																	
670	Ductos de AA	16.8 días	dom 3/1/15	mié 3/18/15																	
671	Tuberia de plomeria	16.8 días	dom 3/1/15	mié 3/18/15																	
672	Tuberia de control contra fuego	14.4 días	mié 3/18/15	jue 4/2/15																	
673	<b>Nivel 200</b>	<b>87.2 días</b>	<b>mié 3/18/15</b>	<b>sáb 6/13/15</b>																	
674	Ductos de AA	16.8 días	mié 3/18/15	sáb 4/4/15																	
675	Tuberia de plomeria	16.8 días	mié 3/18/15	sáb 4/4/15																	

Project: PROYECTO CIUDAD DE LAS ART  
ANALISIS DE IMPACTO DE TIEMPO #1A  
Date: mar 6/10/14

Task		Project Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone	
Split		External Tasks		Manual Task		Start-only		Progress	
Milestone		External Milestone		Duration-only		Finish-only		Deadline	
Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks			



Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	noviembre 21		mayo 1		octubre 11		marzo 21		septiembre 1		febrero 11		julio 21		enero 1		
					11/18	2/3	4/21	7/7	9/22	12/8	2/23	5/11	7/27	10/12	12/28	3/15	5/31	8/16	11/1	1/17	
676	Tubería de control contra fuego	14.4 días	sáb 4/4/15	sáb 4/18/15																	
677	Aparatos Sanitarios	11.2 días	mar 6/2/15	sáb 6/13/15																	
678	Rociadores de Fuego	9.6 días	vie 5/15/15	dom 5/24/15																	
679	Dispositivos de AA	9.6 días	vie 5/15/15	dom 5/24/15																	
680	<b>Trabajo exterior/techo</b>	<b>138.8 días</b>	<b>sáb 2/14/15</b>	<b>vie 7/3/15</b>																	
681	Maquinas de AA	11.2 días	sáb 4/4/15	mié 4/15/15																	
682	Sistema de Impermeabilizacion	24 días	sáb 2/14/15	mar 3/10/15																	
683	Pintura Base & Primera Mano (Exterior)	21 días	vie 5/29/15	vie 6/19/15																	
684	Pintura Final (Exterior)	14 días	vie 6/19/15	vie 7/3/15																	
685	<b>Edificio de la Escuela de Artes Plasticas</b>	<b>865.13 días</b>	<b>mié 4/24/13</b>	<b>dom 9/6/15</b>																	
686	<b>Trabajos estructurales</b>	<b>183.2 días</b>	<b>jue 10/9/14</b>	<b>vie 4/10/15</b>																	
687	<b>Estacionamiento</b>	<b>83.2 días</b>	<b>jue 10/9/14</b>	<b>mié 12/31/14</b>																	
688	Cimientos & Viga Sismica	16.8 días	vie 10/17/14	dom 11/2/14																	
689	Losa de Piso	16.8 días	dom 11/2/14	mié 11/19/14																	
690	Paredes de Hormigon	19.2 días	mié 11/19/14	lun 12/8/14																	
691	Hinca de Pilotes	8 días	jue 10/9/14	vie 10/17/14																	
692	Losa Estructural	22.4 días	lun 12/8/14	mié 12/31/14																	
693	<b>Nivel 100</b>	<b>25 días</b>	<b>mié 12/31/14</b>	<b>dom 1/25/15</b>																	
694	Columnas de Concreto	10 días	mié 12/31/14	sáb 1/10/15																	
695	Losa Estructural	15 días	sáb 1/10/15	dom 1/25/15																	
696	<b>Nivel 200</b>	<b>25 días</b>	<b>dom 1/25/15</b>	<b>jue 2/19/15</b>																	
697	Columnas de Concreto	10 días	dom 1/25/15	mié 2/4/15																	
698	Losa Estructural	15 días	mié 2/4/15	jue 2/19/15																	
699	<b>Nivel 300</b>	<b>25 días</b>	<b>jue 2/19/15</b>	<b>lun 3/16/15</b>																	
700	Columnas de Concreto	10 días	jue 2/19/15	dom 3/1/15																	
701	Losa Estructural	15 días	dom 3/1/15	lun 3/16/15																	
702	<b>Nivel 400</b>	<b>25 días</b>	<b>lun 3/16/15</b>	<b>vie 4/10/15</b>																	
703	Columnas de Concreto	10 días	lun 3/16/15	jue 3/26/15																	
704	Losa Estructural	15 días	jue 3/26/15	vie 4/10/15																	
705	<b>Trabajos de Mamposteria</b>	<b>744.33 días</b>	<b>mié 4/24/13</b>	<b>vie 5/8/15</b>																	
706	Estacionamiento	1 día	mié 4/24/13	mié 4/24/13																	
707	<b>Nivel 100</b>	<b>14 días</b>	<b>jue 2/19/15</b>	<b>jue 3/5/15</b>																	
708	Mamposteria	14 días	jue 2/19/15	jue 3/5/15																	
709	<b>Nivel 200</b>	<b>14 días</b>	<b>lun 3/16/15</b>	<b>lun 3/30/15</b>																	
710	Mamposteria	14 días	lun 3/16/15	lun 3/30/15																	
711	<b>Nivel 300</b>	<b>14 días</b>	<b>vie 4/10/15</b>	<b>vie 4/24/15</b>																	
712	Mamposteria	14 días	vie 4/10/15	vie 4/24/15																	
713	<b>Nivel 400</b>	<b>14 días</b>	<b>vie 4/24/15</b>	<b>vie 5/8/15</b>																	
714	Mamposteria	14 días	vie 4/24/15	vie 5/8/15																	
715	<b>Trabajos de Acabados</b>	<b>148.8 días</b>	<b>vie 4/10/15</b>	<b>dom 9/6/15</b>																	
716	Estacionamiento	5.6 días	vie 4/10/15	mié 4/15/15																	
717	Marcado de Pavimento y Rotulacion	5.6 días	vie 4/10/15	mié 4/15/15																	
718	<b>Nivel 100</b>	<b>105.6 días</b>	<b>vie 4/10/15</b>	<b>vie 7/24/15</b>																	
719	Cristaleria y Ventanas	14.4 días	vie 4/10/15	vie 4/24/15																	
720	Puertas y Herrajes (Exteriores)	4 días	vie 4/24/15	mar 4/28/15																	
721	Paredes de Yeso	24 días	mar 4/28/15	vie 5/22/15																	
722	Puertas y Herrajes (Interiores)	14.4 días	lun 6/15/15	mar 6/30/15																	
723	Cielo Raso	16.8 días	vie 5/22/15	lun 6/8/15																	
724	Acabados de Piso	24 días	vie 5/22/15	lun 6/15/15																	
725	Acabados de Pared (Bano)	11.2 días	lun 6/15/15	vie 6/26/15																	
726	Accesorios de Bano	5.6 días	mié 7/8/15	lun 7/13/15																	
727	Pintura Base & Primera Mano	14.4 días	lun 6/8/15	lun 6/22/15																	

Project: PROYECTO CIUDAD DE LAS ART ANALISIS DE IMPACTO DE TIEMPO #1A  
Date: mar 6/10/14

Task		Project Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone	
Split		External Tasks		Manual Task		Start-only		Progress	
Milestone		External Milestone		Duration-only		Finish-only		Deadline	
Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks			

Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	noviembre 21		mayo 1		octubre 11		marzo 21		septiembre 1		febrero 11		julio 21		enero 1	
					11/18	2/3	4/21	7/7	9/22	12/8	2/23	5/11	7/27	10/12	12/28	3/15	5/31	8/16	11/1	1/17
728	Pintura Final	9.6 días	mié 7/15/15	vie 7/24/15																
729	<b>Nivel 200</b>	<b>105.6 días</b>	<b>vie 4/24/15</b>	<b>sáb 8/8/15</b>																
730	Cristalería y Ventanas	14.4 días	vie 4/24/15	sáb 5/9/15																
731	Puertas y Herrerajes (Exteriores)	4 días	sáb 5/9/15	mié 5/13/15																
732	Paredes de Yeso	24 días	mié 5/13/15	sáb 6/6/15																
733	Puertas y Herrerajes (Interiores)	14.4 días	mar 6/30/15	mar 7/14/15																
734	Cielo Raso	16.8 días	sáb 6/6/15	lun 6/22/15																
735	Acabados de Piso	24 días	sáb 6/6/15	mar 6/30/15																
736	Acabados de Pared (Bano)	11.2 días	mar 6/30/15	sáb 7/11/15																
737	Accesorios de Bano	5.6 días	mié 7/22/15	mar 7/28/15																
738	Pintura Base & Primera Mano	14.4 días	lun 6/22/15	mar 7/7/15																
739	Pintura Final	9.6 días	mié 7/29/15	sáb 8/8/15																
740	<b>Nivel 300</b>	<b>105.6 días</b>	<b>sáb 5/9/15</b>	<b>sáb 8/22/15</b>																
741	Cristalería y Ventanas	14.4 días	sáb 5/9/15	sáb 5/23/15																
742	Puertas y Herrerajes (Exteriores)	4 días	sáb 5/23/15	mié 5/27/15																
743	Paredes de Yeso	24 días	mié 5/27/15	sáb 6/20/15																
744	Puertas y Herrerajes (Interiores)	14.4 días	mar 7/14/15	mar 7/28/15																
745	Cielo Raso	16.8 días	sáb 6/20/15	mar 7/7/15																
746	Acabados de Piso	24 días	sáb 6/20/15	mar 7/14/15																
747	Acabados de Pared (Bano)	11.2 días	mar 7/14/15	sáb 7/25/15																
748	Accesorios de Bano	5.6 días	mié 8/5/15	mar 8/11/15																
749	Pintura Base & Primera Mano	14.4 días	mar 7/7/15	mar 7/21/15																
750	Pintura Final	9.6 días	jue 8/13/15	sáb 8/22/15																
751	<b>Nivel 400</b>	<b>105.6 días</b>	<b>sáb 5/23/15</b>	<b>dom 9/6/15</b>																
752	Cristalería y Ventanas	14.4 días	sáb 5/23/15	sáb 6/6/15																
753	Puertas y Herrerajes (Exteriores)	4 días	sáb 6/6/15	mié 6/10/15																
754	Paredes de Yeso	24 días	mié 6/10/15	sáb 7/4/15																
755	Puertas y Herrerajes (Interiores)	14.4 días	mar 7/28/15	mié 8/12/15																
756	Cielo Raso	16.8 días	sáb 7/4/15	mar 7/21/15																
757	Acabados de Piso	24 días	sáb 7/4/15	mar 7/28/15																
758	Acabados de Pared (Bano)	11.2 días	mar 7/28/15	dom 8/9/15																
759	Accesorios de Bano	5.6 días	jue 8/20/15	mar 8/25/15																
760	Pintura Base & Primera Mano	14.4 días	mar 7/21/15	mié 8/5/15																
761	Pintura Final	9.6 días	jue 8/27/15	dom 9/6/15																
762	<b>Trabajos electricos</b>	<b>280.8 días</b>	<b>mié 11/19/14</b>	<b>jue 8/27/15</b>																
763	<b>Estacionamiento</b>	<b>11.2 días</b>	<b>mié 11/19/14</b>	<b>dom 11/30/14</b>																
764	Tubería Eléctrica Empotrada (Pared)	11.2 días	mié 11/19/14	dom 11/30/14																
765	<b>Nivel 100</b>	<b>186 días</b>	<b>sáb 1/10/15</b>	<b>mié 7/15/15</b>																
766	Tubería de sistema especiales (Telefono & CCTV)	9.6 días	dom 4/5/15	mié 4/15/15																
767	Tubería de eléctrica	14.4 días	dom 3/22/15	dom 4/5/15																
768	Cableado eléctrico	11.2 días	vie 5/22/15	mar 6/2/15																
769	Accesorios de Electricidad y sistema especiales	11.2 días	lun 6/22/15	sáb 7/4/15																
770	Lamparas	9.6 días	sáb 7/4/15	lun 7/13/15																
771	Equipo de Alarma contra incendio	11.2 días	sáb 7/4/15	mié 7/15/15																
772	Tubería Eléctrica Empotrada (Piso)	7 días	sáb 1/10/15	sáb 1/17/15																
773	<b>Nivel 200</b>	<b>175.4 días</b>	<b>mié 2/4/15</b>	<b>mié 7/29/15</b>																
774	Tubería de eléctrica	14.4 días	jue 4/16/15	jue 4/30/15																
775	Tubería de sistema especiales (Telefono & CCTV)	9.6 días	jue 4/30/15	dom 5/10/15																
776	Cableado eléctrico	11.2 días	sáb 6/6/15	mié 6/17/15																
777	Accesorios de Electricidad y sistema especiales	11.2 días	mar 7/7/15	sáb 7/18/15																
778	Lamparas	9.6 días	sáb 7/18/15	mar 7/28/15																
779	Equipo de Alarma contra incendio	11.2 días	sáb 7/18/15	mié 7/29/15																

Project: PROYECTO CIUDAD DE LAS ART  
ANÁLISIS DE IMPACTO DE TIEMPO #1A  
Date: mar 6/10/14

Task		Project Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone	
Split		External Tasks		Manual Task		Start-only		Progress	
Milestone		External Milestone		Duration-only		Finish-only		Deadline	
Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks			


Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	noviembre 21		mayo 1		octubre 11		marzo 21		septiembre 1		febrero 11		julio 21		enero 1	
					11/18	2/3	4/21	7/7	9/22	12/8	2/23	5/11	7/27	10/12	12/28	3/15	5/31	8/16	11/1	1/17
780	Tubería Eléctrica Empotrada (Piso)	7 días	mié 2/4/15	mié 2/11/15																
781	<b>Nivel 300</b>	<b>164.8 días</b>	<b>dom 3/1/15</b>	<b>jue 8/13/15</b>																
782	Tubería de eléctrica	14.4 días	lun 5/11/15	lun 5/25/15																
783	Tubería de sistema especiales (Telefono & CCTV)	9.6 días	lun 5/25/15	jue 6/4/15																
784	Cableado eléctrico	11.2 días	sáb 6/20/15	mié 7/1/15																
785	Accesorios de Electricidad y sistema especiales	11.2 días	mar 7/21/15	sáb 8/1/15																
786	Lamparas	9.6 días	sáb 8/1/15	mar 8/11/15																
787	Equipo de Alarma contra incendio	11.2 días	sáb 8/1/15	jue 8/13/15																
788	Tubería Eléctrica Empotrada (Piso)	7 días	dom 3/1/15	dom 3/8/15																
789	<b>Nivel 400</b>	<b>154.2 días</b>	<b>jue 3/26/15</b>	<b>jue 8/27/15</b>																
790	Tubería de eléctrica	14.4 días	mié 5/27/15	jue 6/11/15																
791	Tubería de sistema especiales (Telefono & CCTV)	9.6 días	jue 6/11/15	sáb 6/20/15																
792	Cableado eléctrico	11.2 días	sáb 7/4/15	jue 7/16/15																
793	Accesorios de Electricidad y sistema especiales	11.2 días	mié 8/5/15	dom 8/16/15																
794	Lamparas	9.6 días	dom 8/16/15	mar 8/25/15																
795	Equipo de Alarma contra incendio	11.2 días	dom 8/16/15	jue 8/27/15																
796	Tubería Eléctrica Empotrada (Piso)	7 días	jue 3/26/15	jue 4/2/15																
797	<b>Trabajos plomería/mecánica</b>	<b>290.4 días</b>	<b>dom 11/2/14</b>	<b>jue 8/20/15</b>																
798	<b>Estacionamiento</b>	<b>64 días</b>	<b>dom 11/2/14</b>	<b>lun 1/5/15</b>																
799	Tubería de control contra fuego	5.6 días	mié 12/31/14	lun 1/5/15																
800	Tubería Plomería Empotrada (Piso)	11.2 días	dom 11/2/14	vie 11/14/14																
801	Tubería Plomería Empotrada (Pared)	11.2 días	mié 11/19/14	dom 11/30/14																
802	<b>Nivel 100</b>	<b>124.8 días</b>	<b>jue 3/5/15</b>	<b>mié 7/8/15</b>																
803	Aparatos Sanitarios	11.2 días	vie 6/26/15	mié 7/8/15																
804	Rociadores de Fuego	9.6 días	lun 6/8/15	jue 6/18/15																
805	Dispositivos de AA	9.6 días	lun 6/8/15	jue 6/18/15																
806	Ductos de AA	16.8 días	jue 3/5/15	dom 3/22/15																
807	Tubería de plomería	16.8 días	jue 3/5/15	dom 3/22/15																
808	Tubería de control contra fuego	14.4 días	dom 3/22/15	dom 4/5/15																
809	<b>Nivel 200</b>	<b>114.2 días</b>	<b>lun 3/30/15</b>	<b>mié 7/22/15</b>																
810	Ductos de AA	16.8 días	lun 3/30/15	jue 4/16/15																
811	Tubería de plomería	16.8 días	lun 3/30/15	jue 4/16/15																
812	Tubería de control contra fuego	14.4 días	jue 4/16/15	jue 4/30/15																
813	Aparatos Sanitarios	11.2 días	sáb 7/11/15	mié 7/22/15																
814	Rociadores de Fuego	9.6 días	lun 6/22/15	jue 7/2/15																
815	Dispositivos de AA	9.6 días	lun 6/22/15	jue 7/2/15																
816	<b>Nivel 300</b>	<b>103.6 días</b>	<b>vie 4/24/15</b>	<b>mié 8/5/15</b>																
817	Ductos de AA	16.8 días	vie 4/24/15	lun 5/11/15																
818	Tubería de plomería	16.8 días	vie 4/24/15	lun 5/11/15																
819	Tubería de control contra fuego	14.4 días	lun 5/11/15	lun 5/25/15																
820	Aparatos Sanitarios	11.2 días	sáb 7/25/15	mié 8/5/15																
821	Rociadores de Fuego	9.6 días	mar 7/7/15	jue 7/16/15																
822	Dispositivos de AA	9.6 días	mar 7/7/15	jue 7/16/15																
823	<b>Nivel 400</b>	<b>101.2 días</b>	<b>lun 5/11/15</b>	<b>jue 8/20/15</b>																
824	Ductos de AA	16.8 días	lun 5/11/15	mié 5/27/15																
825	Tubería de plomería	16.8 días	lun 5/11/15	mié 5/27/15																
826	Tubería de control contra fuego	14.4 días	mié 5/27/15	jue 6/11/15																
827	Rociadores de Fuego	9.6 días	mar 7/21/15	vie 7/31/15																
828	Aparatos Sanitarios	11.2 días	dom 8/9/15	jue 8/20/15																
829	Dispositivos de AA	9.6 días	mar 7/21/15	vie 7/31/15																
830	<b>Trabajo exterior/techo</b>	<b>92.6 días</b>	<b>vie 4/10/15</b>	<b>sáb 7/11/15</b>																
831	Maquinas de AA	11.2 días	mié 5/27/15	lun 6/8/15																

Project: PROYECTO CIUDAD DE LAS ART ANALISIS DE IMPACTO DE TIEMPO #1A Date: mar 6/10/14	Task		Project Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone	
	Split		External Tasks		Manual Task		Start-only		Progress	
	Milestone		External Milestone		Duration-only		Finish-only		Deadline	
	Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks			

Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	noviembre 21		mayo 1		octubre 11		marzo 21		septiembre 1		febrero 11		julio 21		enero 1	
					11/18	2/3	4/21	7/7	9/22	12/8	2/23	5/11	7/27	10/12	12/28	3/15	5/31	8/16	11/1	1/17
832	Sistema de Impermeabilizacion	24 días	vie 4/10/15	lun 5/4/15																
833	Pintura Base & Primera Mano (Exterior)	21 días	sáb 6/6/15	sáb 6/27/15																
834	Pintura Final (Exterior)	14 días	sáb 6/27/15	sáb 7/11/15																
835	Edificio de Estacionamiento	839.13 días	mié 4/24/13	mar 8/11/15																
836	Trabajos estructurales	263 días	vie 10/17/14	mar 7/7/15																
837	Nivel 000	75 días	vie 10/17/14	mié 12/31/14																
838	Cimientos & Viga Sismica	14 días	dom 10/26/14	dom 11/9/14																
839	Losa de Piso	14 días	dom 11/9/14	dom 11/23/14																
840	Paredes de Hormigon	18 días	dom 11/23/14	jue 12/11/14																
841	Hinca de Pilotes	9 días	vie 10/17/14	dom 10/26/14																
842	Losa Estructural	20 días	jue 12/11/14	mié 12/31/14																
843	Nivel 100	36 días	mié 12/31/14	jue 2/5/15																
844	Paredes de Hormigon	16 días	mié 12/31/14	vie 1/16/15																
845	Losa Estructural	20 días	vie 1/16/15	jue 2/5/15																
846	Nivel 200	36 días	jue 2/5/15	vie 3/13/15																
847	Paredes de Hormigon	16 días	jue 2/5/15	sáb 2/21/15																
848	Losa Estructural	20 días	sáb 2/21/15	vie 3/13/15																
849	Nivel 300	36 días	vie 3/13/15	sáb 4/18/15																
850	Paredes de Hormigon	16 días	vie 3/13/15	dom 3/29/15																
851	Losa Estructural	20 días	dom 3/29/15	sáb 4/18/15																
852	Nivel 400	36 días	sáb 4/18/15	dom 5/24/15																
853	Paredes de Hormigon	16 días	sáb 4/18/15	lun 5/4/15																
854	Losa Estructural	20 días	lun 5/4/15	dom 5/24/15																
855	Nivel 500	36 días	dom 5/24/15	lun 6/29/15																
856	Paredes de Hormigon	16 días	dom 5/24/15	mar 6/9/15																
857	Losa Estructural	20 días	mar 6/9/15	lun 6/29/15																
858	Nivel 600	8 días	lun 6/29/15	mar 7/7/15																
859	Paredes de Hormigon	8 días	lun 6/29/15	mar 7/7/15																
860	Trabajos de Mamposteria	1 día	mié 4/24/13	mié 4/24/13																
861	Nivel 000	1 día	mié 4/24/13	mié 4/24/13																
862	Nivel 100	1 día	mié 4/24/13	mié 4/24/13																
863	Nivel 200	1 día	mié 4/24/13	mié 4/24/13																
864	Nivel 300	1 día	mié 4/24/13	mié 4/24/13																
865	Nivel 400	1 día	mié 4/24/13	mié 4/24/13																
866	Nivel 500	1 día	mié 4/24/13	mié 4/24/13																
867	Nivel 600	1 día	mié 4/24/13	mié 4/24/13																
868	Trabajos de Acabados	190.4 días	lun 1/5/15	mié 7/15/15																
869	Nivel 000	5.6 días	lun 1/5/15	dom 1/11/15																
870	Marcado de Pavimento y Rotulacion	5.6 días	lun 1/5/15	dom 1/11/15																
871	Nivel 100	5.6 días	mié 2/11/15	lun 2/16/15																
872	Marcado de Pavimento y Rotulacion	5.6 días	mié 2/11/15	lun 2/16/15																
873	Nivel 200	5.6 días	jue 3/19/15	mar 3/24/15																
874	Marcado de Pavimento y Rotulacion	5.6 días	jue 3/19/15	mar 3/24/15																
875	Nivel 300	5.6 días	vie 4/24/15	mié 4/29/15																
876	Marcado de Pavimento y Rotulacion	5.6 días	vie 4/24/15	mié 4/29/15																
877	Nivel 400	5.6 días	sáb 5/30/15	jue 6/4/15																
878	Marcado de Pavimento y Rotulacion	5.6 días	sáb 5/30/15	jue 6/4/15																
879	Nivel 500	5.6 días	dom 7/5/15	vie 7/10/15																
880	Marcado de Pavimento y Rotulacion	5.6 días	dom 7/5/15	vie 7/10/15																
881	Nivel 600	4 días	sáb 7/11/15	mié 7/15/15																
882	Marcado de Pavimento y Rotulacion	4 días	sáb 7/11/15	mié 7/15/15																
883	Trabajos electricos	224 días	dom 11/23/14	dom 7/5/15																


Project: PROYECTO CIUDAD DE LAS ART  
ANALISIS DE IMPACTO DE TIEMPO #1A  
Date: mar 6/10/14

Task		Project Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone	
Split		External Tasks		Manual Task		Start-only		Progress	
Milestone		External Milestone		Duration-only		Finish-only		Deadline	
Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks			

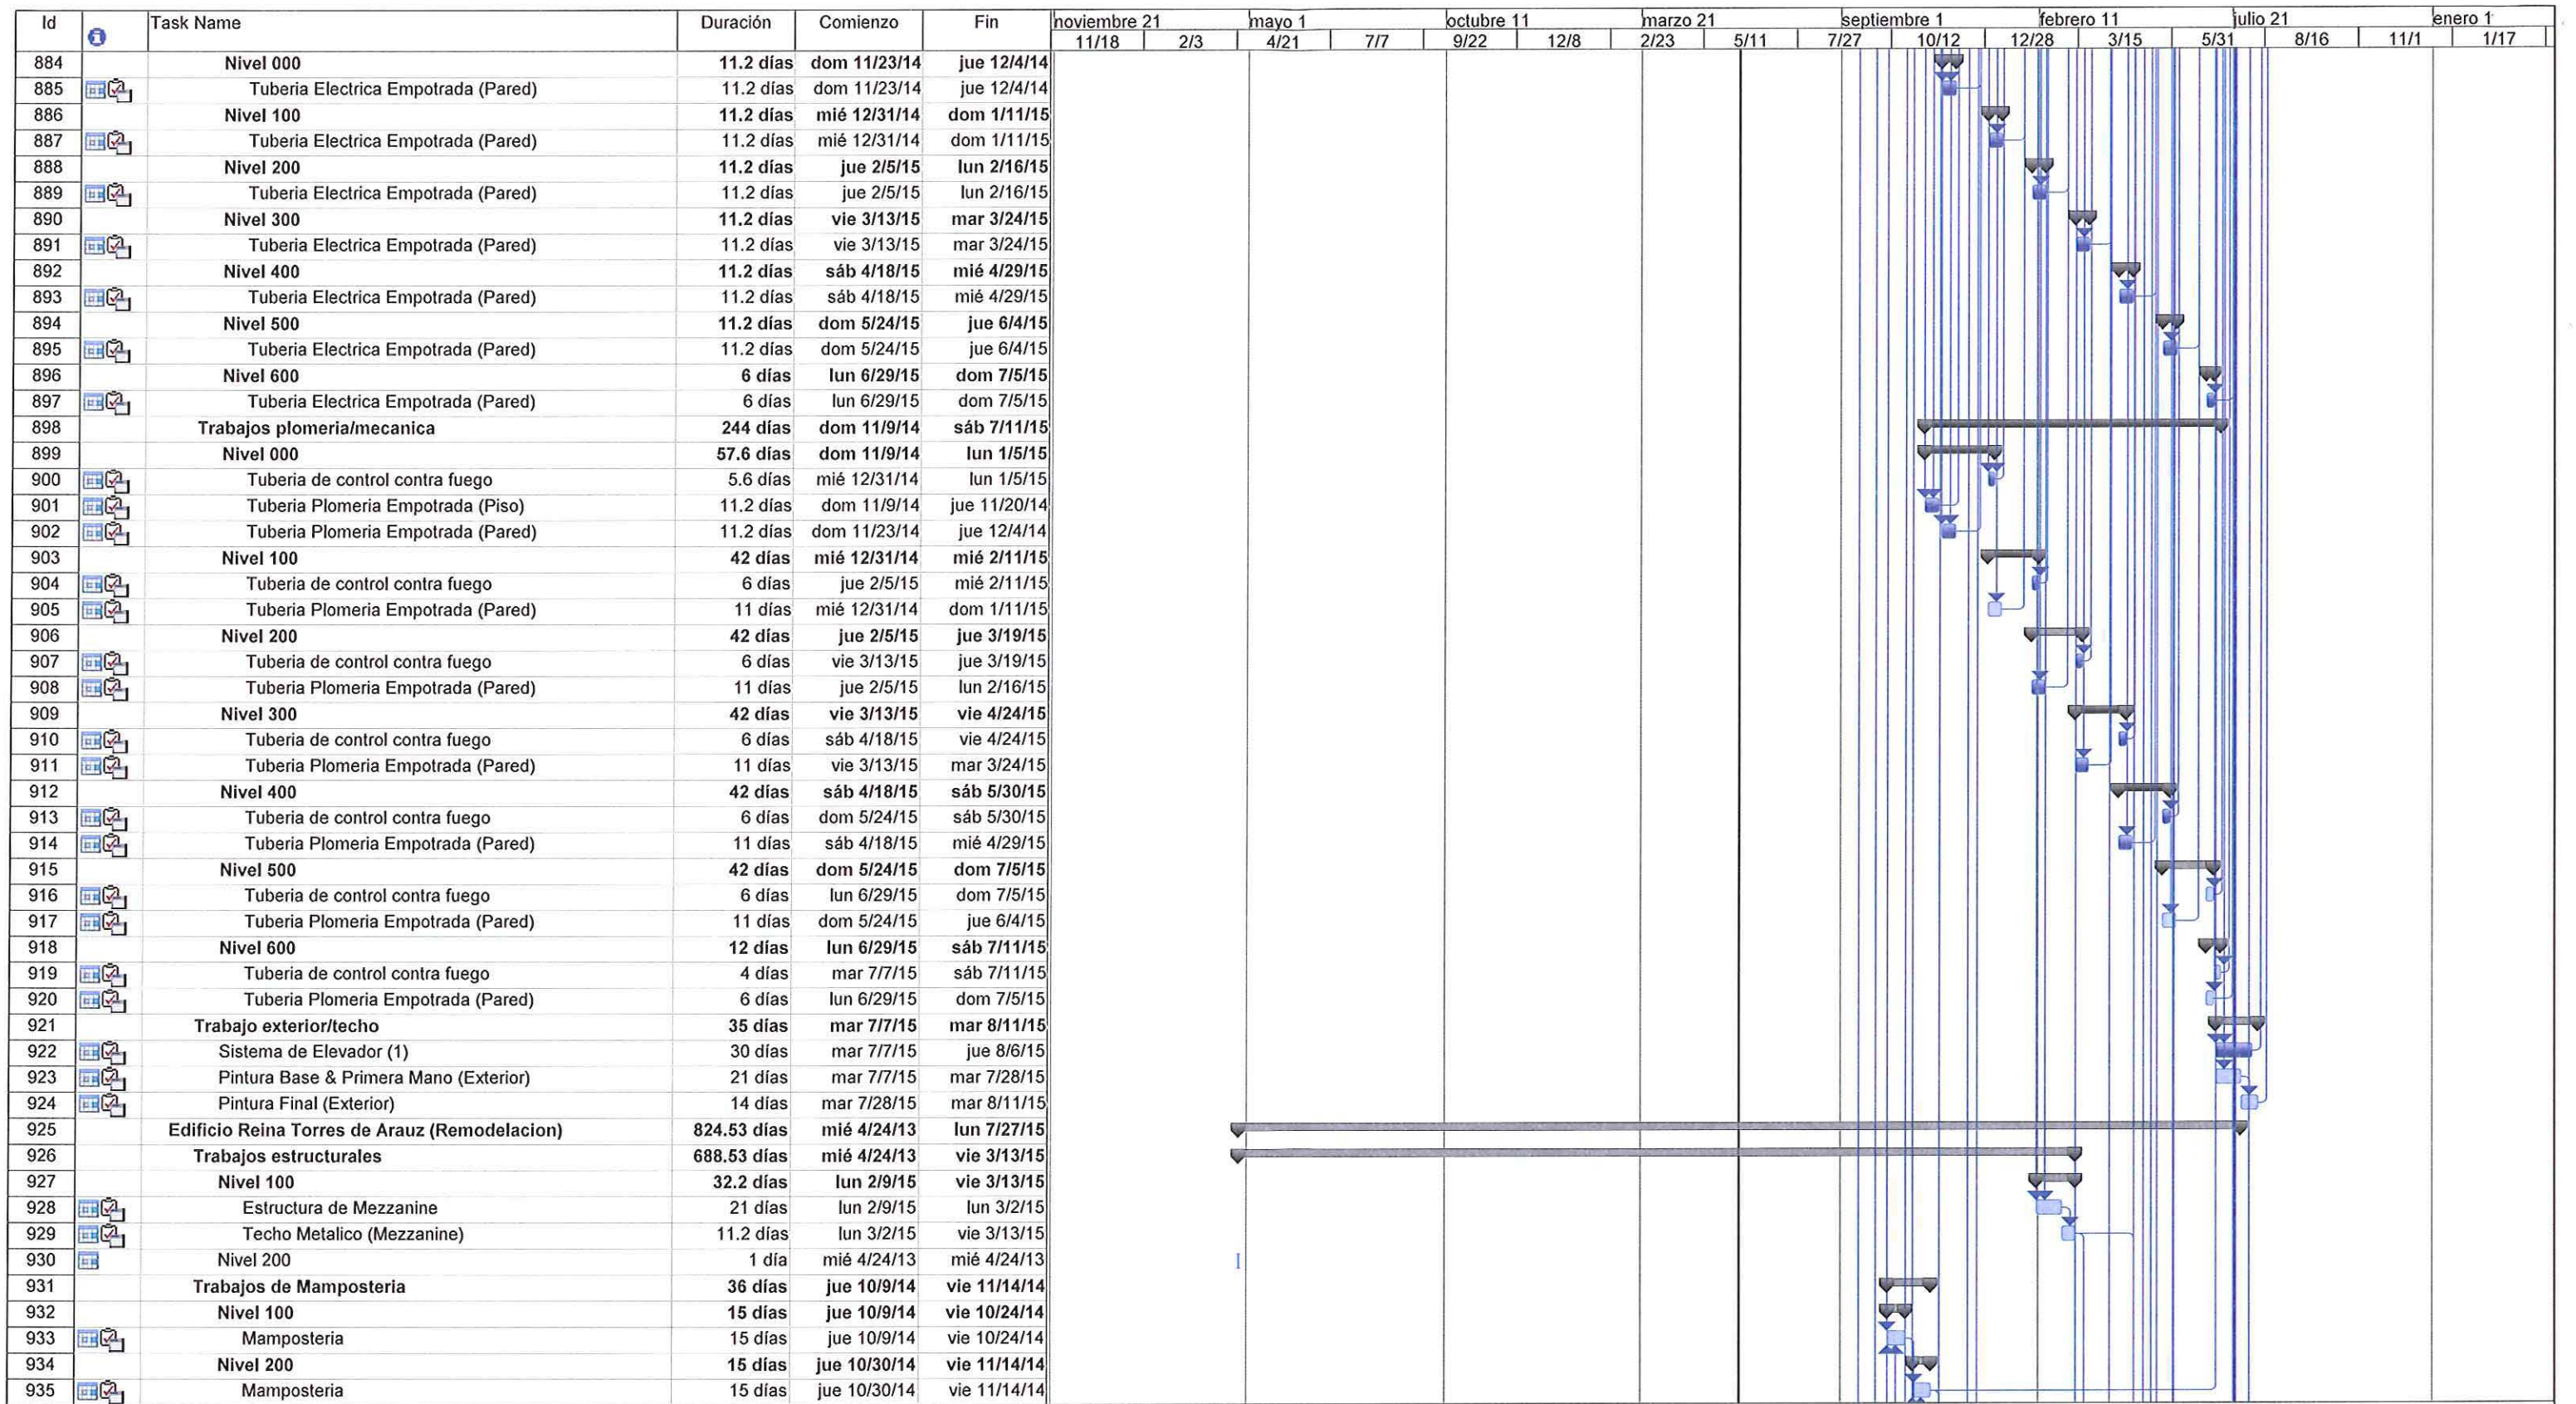

Project: PROYECTO CIUDAD DE LAS ART ANÁLISIS DE IMPACTO DE TIEMPO #1A Date: mar 6/10/14	Task		Project Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone	
	Split		External Tasks		Manual Task		Start-only		Progress	
	Milestone		External Milestone		Duration-only		Finish-only		Deadline	
	Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks			

Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	noviembre 21		mayo 1		octubre 11		marzo 21		septiembre 1		febrero 11		julio 21		enero 1	
					11/18	2/3	4/21	7/7	9/22	12/8	2/23	5/11	7/27	10/12	12/28	3/15	5/31	8/16	11/1	1/17
936	<b>Trabajos de Acabados</b>	231.4 días	lun 12/8/14	lun 7/27/15																
937	<b>Nivel 100</b>	203.4 días	lun 12/8/14	lun 6/29/15																
938	Ventanas	14.4 días	lun 12/8/14	lun 12/22/14																
939	Puertas y Herrajes (Exteriores)	4 días	lun 12/22/14	vie 12/26/14																
940	Paredes de Yeso	28 días	vie 3/13/15	vie 4/10/15																
941	Puertas y Herrajes (Interiores)	18 días	vie 5/8/15	mar 5/26/15																
942	Cielo Raso	20 días	vie 4/10/15	jue 4/30/15																
943	Acabados de Piso	28 días	vie 4/10/15	vie 5/8/15																
944	Acabados de Pared (Bano)	11.2 días	vie 5/8/15	mar 5/19/15																
945	Accesorios de Bano	5.6 días	mar 6/2/15	lun 6/8/15																
946	Pintura Base & Primera Mano	14.4 días	jue 4/30/15	jue 5/14/15																
947	Pintura Final	9.6 días	vie 6/19/15	lun 6/29/15																
948	<b>Nivel 200</b>	217 días	lun 12/22/14	lun 7/27/15																
949	Ventanas	14.4 días	lun 12/22/14	lun 1/5/15																
950	Puertas y Herrajes (Exteriores)	4 días	lun 1/5/15	vie 1/9/15																
951	Paredes de Yeso	28 días	vie 4/10/15	vie 5/8/15																
952	Puertas y Herrajes (Interiores)	18 días	vie 6/5/15	mar 6/23/15																
953	Cielo Raso	20 días	vie 5/8/15	jue 5/28/15																
954	Acabados de Piso	28 días	vie 5/8/15	vie 6/5/15																
955	Acabados de Pared (Bano)	11.2 días	vie 6/5/15	mar 6/16/15																
956	Accesorios de Bano	5.6 días	mar 6/30/15	lun 7/6/15																
957	Pintura Base & Primera Mano	14.4 días	jue 5/28/15	jue 6/11/15																
958	Pintura Final	9.6 días	vie 7/17/15	lun 7/27/15																
959	<b>Trabajos electricos</b>	311.8 días	mar 9/9/14	vie 7/17/15																
960	<b>Nivel 100</b>	283.8 días	mar 9/9/14	vie 6/19/15																
961	Demolicion & Tuberia de sistema especiales (Telefono	9.6 días	mar 9/30/14	jue 10/9/14																
962	Demolicion selectiva & Tuberia de electrica	21 días	mar 9/9/14	mar 9/30/14																
963	Cableado electrico	18 días	vie 4/10/15	mar 4/28/15																
964	Accesorios de Electricidad y sistema especiales	18 días	jue 5/14/15	lun 6/1/15																
965	Lamparas	16 días	lun 6/1/15	mié 6/17/15																
966	Equipo de Alarma contra incendio	18 días	lun 6/1/15	vie 6/19/15																
967	<b>Nivel 200</b>	290.8 días	mar 9/30/14	vie 7/17/15																
968	Demolicion selectiva & Tuberia de electrica	21 días	mar 9/30/14	mar 10/21/14																
969	Demolicion & Tuberia de sistema especiales (Telefono	9.6 días	mar 10/21/14	jue 10/30/14																
970	Cableado electrico	18 días	vie 5/8/15	mar 5/26/15																
971	Accesorios de Electricidad y sistema especiales	18 días	jue 6/11/15	lun 6/29/15																
972	Lamparas	16 días	lun 6/29/15	mié 7/15/15																
973	Equipo de Alarma contra incendio	18 días	lun 6/29/15	vie 7/17/15																
974	<b>Trabajos plomeria/mecanica</b>	294.6 días	mar 9/9/14	mar 6/30/15																
975	<b>Nivel 100</b>	266.6 días	mar 9/9/14	mar 6/2/15																
976	Aparatos Sanitarios	14 días	mar 5/19/15	mar 6/2/15																
977	Rociadores de Fuego	16 días	jue 4/30/15	sáb 5/16/15																
978	Dispositivos de AA	16 días	jue 4/30/15	sáb 5/16/15																
979	Ductos de AA	28 días	vie 10/24/14	vie 11/21/14																
980	Tuberia de plomeria	21 días	mar 9/9/14	mar 9/30/14																
981	Tuberia de control contra fuego	18 días	vie 11/21/14	mar 12/9/14																
982	<b>Nivel 200</b>	273.6 días	mar 9/30/14	mar 6/30/15																
983	Ductos de AA	28 días	vie 11/21/14	vie 12/19/14																
984	Tuberia de plomeria	21 días	mar 9/30/14	mar 10/21/14																
985	Tuberia de control contra fuego	18 días	vie 12/19/14	mar 1/6/15																
986	Aparatos Sanitarios	14 días	mar 6/16/15	mar 6/30/15																
987	Rociadores de Fuego	18 días	jue 5/28/15	lun 6/15/15																

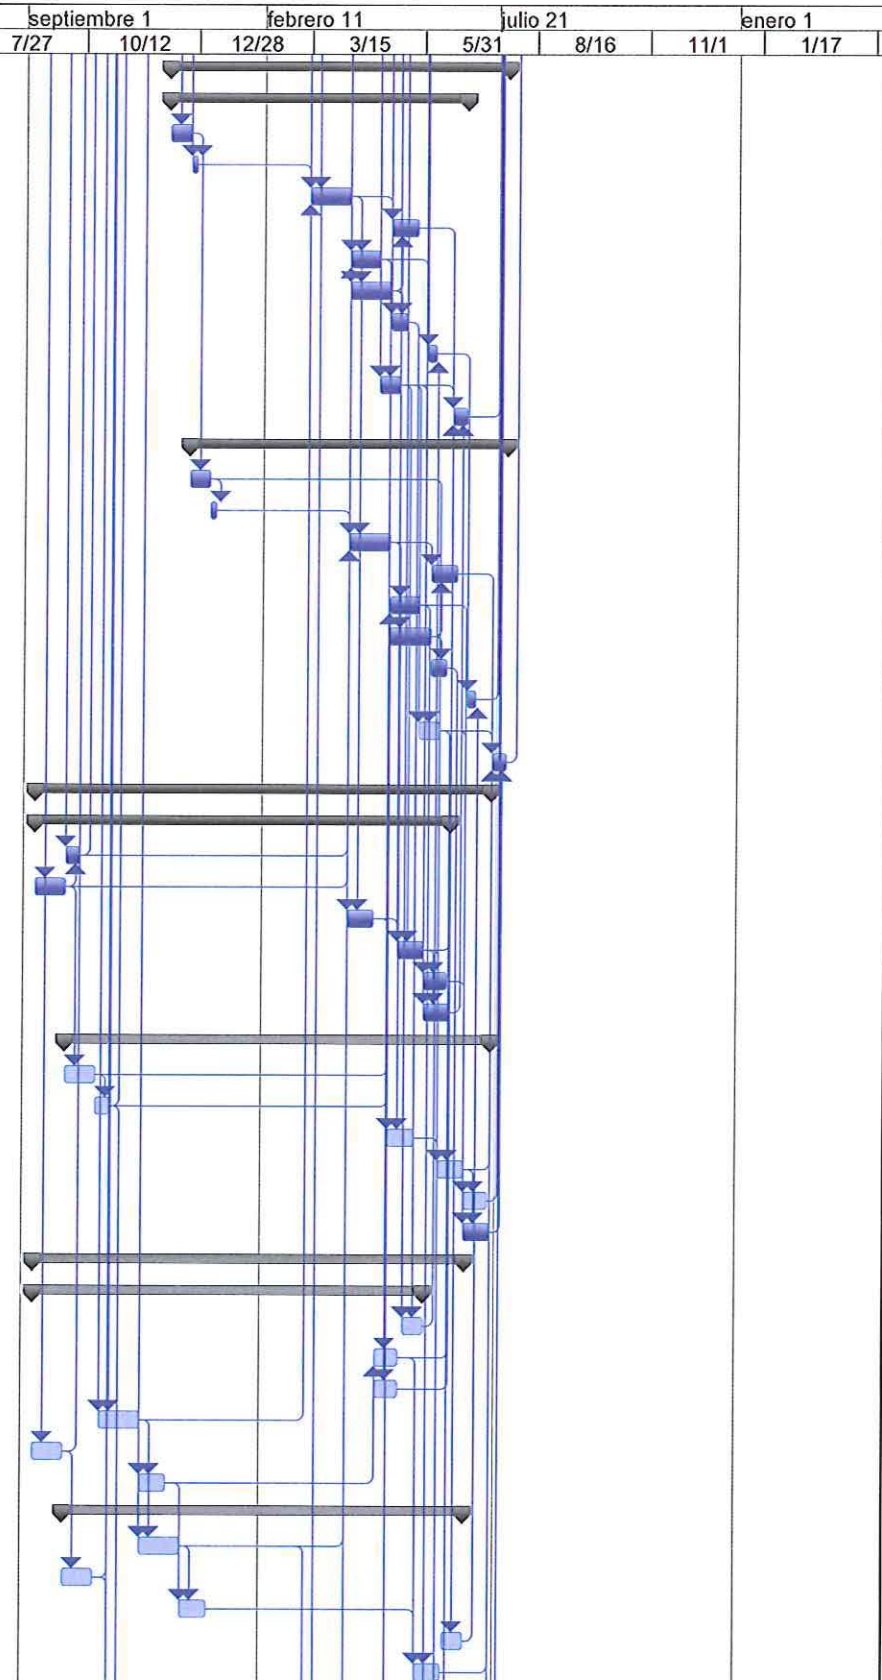

Project: PROYECTO CIUDAD DE LAS ART  
ANALISIS DE IMPACTO DE TIEMPO #1A  
Date: mar 6/10/14

Task		Project Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone	
Split		External Tasks		Manual Task		Start-only		Progress	
Milestone		External Milestone		Duration-only		Finish-only		Deadline	
Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks			

Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	noviembre 21		mayo 1		octubre 11		marzo 21		septiembre 1		febrero 11		julio 21		enero 17	
					11/18	2/3	4/21	7/7	9/22	12/8	2/23	5/11	7/27	10/12	12/28	3/15	5/31	8/16	11/1	1/17
988	Dispositivos de AA	18 días	jue 5/28/15	lun 6/15/15																
989	Trabajo exterior/techo	259.2 días	jue 10/30/14	jue 7/16/15																
990	Maquinas de AA	11.2 días	vie 3/13/15	mar 3/24/15																
991	Sistema de Impermeabilizacion	28 días	jue 10/30/14	jue 11/27/14																
992	Pintura Base & Primera Mano (Exterior)	21 días	jue 6/11/15	jue 7/2/15																
993	Pintura Final (Exterior)	14 días	jue 7/2/15	jue 7/16/15																

Project: PROYECTO CIUDAD DE LAS ART ANALISIS DE IMPACTO DE TIEMPO #1A Date: mar 6/10/14	Task		Project Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone	
	Split		External Tasks		Manual Task		Start-only		Progress	
	Milestone		External Milestone		Duration-only		Finish-only		Deadline	
	Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks			

Id	Area	Duracion	% Completado	Comienzo	Terminacion	Gantt Chart Timeline											
						2010	octubre 1, 2011		octubre 11, 2012		octubre 21, 2013		noviembre 1, 2014		noviembre 11, 2015		
						5/29	11/27	5/27	11/25	5/26	11/24	5/25	11/23	5/24	11/22	5/22	
1	Administracion del Proyecto	802.36 días	27%	mar 4/23/13	sáb 7/4/15	[Gantt bar for Administracion del Proyecto]											
2	Orden de Proceder	0 días	100%	mar 4/23/13	mar 4/23/13	[Gantt bar for Orden de Proceder]											
3	Anticipo (20%)	78 días	100%	mar 4/23/13	mar 7/9/13	[Gantt bar for Anticipo (20%)]											
4	Correccion de Deficiencias	14 días	0%	sáb 6/20/15	sáb 7/4/15	[Gantt bar for Correccion de Deficiencias]											
5	Movilizacion	26.5 días	100%	lun 9/23/13	lun 12/23/13	[Gantt bar for Movilizacion]											
6	Entrega de Proyecto (Contractual)	0 días	0%	mié 1/28/15	mié 1/28/15	[Gantt bar for Entrega de Proyecto (Contractual)]											
7	Entrega de Proyecto (Proyectada)	0 días	0%	sáb 7/4/15	sáb 7/4/15	[Gantt bar for Entrega de Proyecto (Proyectada)]											
8	ASUNTOS DE PROYECTO	217 días	72%	mié 10/2/13	mié 5/7/14	[Gantt bar for ASUNTOS DE PROYECTO]											
9	Aprobacion de Bombero	217 días	72%	mié 10/2/13	mié 5/7/14	[Gantt bar for Aprobacion de Bombero]											
10	Visita de Bombero	1 día	100%	mié 10/2/13	jue 10/3/13	[Gantt bar for Visita de Bombero]											
11	Desocupar y Desconectar energia edificio	31 días	100%	dom 12/1/13	mar 12/31/13	[Gantt bar for Desocupar y Desconectar energia edificio]											
12	Aprobacion Permiso de Demolicion	3.88 días	100%	mar 12/31/13	vie 1/3/14	[Gantt bar for Aprobacion Permiso de Demolicion]											
13	Huelga SUNTRACS	14 días	0%	mié 4/23/14	mié 5/7/14	[Gantt bar for Huelga SUNTRACS]											
14	Huelga SUNTRACS	14 días	0%	mié 4/23/14	mié 5/7/14	[Gantt bar for Huelga SUNTRACS]											
15	Terminacion Sustancial	116.36 días	0%	lun 2/23/15	sáb 6/20/15	[Gantt bar for Terminacion Sustancial]											
16	Edificio Reina Torres de Arauz	0 días	0%	vie 5/8/15	vie 5/8/15	[Gantt bar for Edificio Reina Torres de Arauz]											
17	Edificio de la Escuela de Artes Plasticas	0 días	0%	lun 2/23/15	lun 2/23/15	[Gantt bar for Edificio de la Escuela de Artes Plasticas]											
18	Edificio de la Escuela de Teatro/Musica	0 días	0%	sáb 6/20/15	sáb 6/20/15	[Gantt bar for Edificio de la Escuela de Teatro/Musica]											
19	Edificio de la Escuela de Danzas y Ballet	0 días	0%	vie 6/19/15	vie 6/19/15	[Gantt bar for Edificio de la Escuela de Danzas y Ballet]											
20	Auditorio	0 días	0%	mar 4/14/15	mar 4/14/15	[Gantt bar for Auditorio]											
21	Edificio de Estacionamiento	0 días	0%	jue 3/12/15	jue 3/12/15	[Gantt bar for Edificio de Estacionamiento]											
22	Trabajos de Urbanizacion	0 días	0%	jue 5/21/15	jue 5/21/15	[Gantt bar for Trabajos de Urbanizacion]											
23	Estudios Preliminares	199.88 días	100%	mar 4/23/13	vie 11/8/13	[Gantt bar for Estudios Preliminares]											
24	Estudio de Impacto Ambiental	13.88 días	100%	mar 4/23/13	lun 5/6/13	[Gantt bar for Estudio de Impacto Ambiental]											
25	Estudio de Suelo	0.88 días	100%	mar 4/23/13	mar 4/23/13	[Gantt bar for Estudio de Suelo]											
26	Estudio Hidrologico e Hidraulico	0.88 días	100%	mar 4/23/13	mar 4/23/13	[Gantt bar for Estudio Hidrologico e Hidraulico]											
27	Topografia	25.74 días	100%	mar 4/23/13	vie 11/8/13	[Gantt bar for Topografia]											
28	Estudio de transito	0.88 días	100%	mar 4/23/13	mar 4/23/13	[Gantt bar for Estudio de transito]											
29	Diseno Conceptual Urbanismo, Anteproyecto, Planos y Especificaciones	391.11 días	80%	mar 4/23/13	lun 5/19/14	[Gantt bar for Diseno Conceptual Urbanismo, Anteproyecto, Planos y Especificaciones]											
30	Anteproyecto Municipal	297.88 días	86%	mar 4/23/13	vie 2/14/14	[Gantt bar for Anteproyecto Municipal]											
31	Elaboracion de Plan Maestro y Diseno Conceptual	21 días	85%	mar 4/23/13	vie 4/4/14	[Gantt bar for Elaboracion de Plan Maestro y Diseno Conceptual]											
32	Anteproyecto Arquitectonico (Para INAC)	69.88 días	70%	mar 4/23/13	lun 4/21/14	[Gantt bar for Anteproyecto Arquitectonico (Para INAC)]											
33	Desarrollo de Planos Constructivos y Especificaciones Tecnicas (50%)	6.25 días	100%	vie 11/22/13	vie 12/6/13	[Gantt bar for Desarrollo de Planos Constructivos y Especificaciones Tecnicas (50%)]											
34	Desarrollo de Planos Constructivos y Especificaciones Tecnicas (75%)	41.08 días	90%	vie 12/6/13	dom 4/13/14	[Gantt bar for Desarrollo de Planos Constructivos y Especificaciones Tecnicas (75%)]											
35	Desarrollo de Planos Constructivos y Especificaciones Tecnicas (100%)	21 días	0%	lun 4/28/14	lun 5/19/14	[Gantt bar for Desarrollo de Planos Constructivos y Especificaciones Tecnicas (100%)]											
36	Permisos y Aprobaciones	426.98 días	70%	mar 4/23/13	mar 6/24/14	[Gantt bar for Permisos y Aprobaciones]											
37	Aprobacion del Anteproyecto Municipal	119.88 días	86%	mar 4/23/13	lun 3/3/14	[Gantt bar for Aprobacion del Anteproyecto Municipal]											
38	Aprobacion del Anteproyecto Arquitectonico por el INAC	81.88 días	70%	vie 4/26/13	vie 5/16/14	[Gantt bar for Aprobacion del Anteproyecto Arquitectonico por el INAC]											
39	Aprobacion del Estudio de Impacto Ambiental	49.88 días	100%	lun 5/6/13	lun 6/24/13	[Gantt bar for Aprobacion del Estudio de Impacto Ambiental]											
40	Aprobacion de Planos Constructivos y Especificaciones Tecnicas (50%) por e	16 días	50%	vie 11/22/13	mar 4/8/14	[Gantt bar for Aprobacion de Planos Constructivos y Especificaciones Tecnicas (50%) por e]											
41	Aprobacion de Planos Constructivos y Especificaciones Tecnicas (75%) por e	15 días	0%	dom 4/13/14	lun 4/28/14	[Gantt bar for Aprobacion de Planos Constructivos y Especificaciones Tecnicas (75%) por e]											
42	Aprobacionde Planos Constructivos y Especificaciones Tecnicas (100%) por e	15 días	0%	lun 5/19/14	mar 6/3/14	[Gantt bar for Aprobacionde Planos Constructivos y Especificaciones Tecnicas (100%) por e]											
43	Permiso de Construccion Provisional	19.06 días	100%	mié 8/21/13	lun 9/9/13	[Gantt bar for Permiso de Construccion Provisional]											
44	Permiso de Construccion Final	21 días	0%	mar 6/3/14	mar 6/24/14	[Gantt bar for Permiso de Construccion Final]											
45	Remisiones	313.98 días	10%	vie 11/15/13	jue 9/25/14	[Gantt bar for Remisiones]											
46	Sometimiento	172.98 días	18%	jue 11/21/13	mar 5/13/14	[Gantt bar for Sometimiento]											
47	Pilotes	14.88 días	100%	vie 11/22/13	vie 12/6/13	[Gantt bar for Pilotes]											
48	Dibujos de Taller de Acero de Refuerzo	95.88 días	100%	lun 11/25/13	vie 2/28/14	[Gantt bar for Dibujos de Taller de Acero de Refuerzo]											
49	Diseno de Mezcla de Concreto	6.88 días	100%	jue 11/21/13	mié 11/27/13	[Gantt bar for Diseno de Mezcla de Concreto]											
50	Bloques de Concreto	30 días	0%	dom 4/13/14	mar 5/13/14	[Gantt bar for Bloques de Concreto]											

PROYECTO : CIUDAD DE LAS ARTES

TIME IMPACT ANALYSIS #1B

OMEGA ENGINEERING, INC



Anexo D






















Id	Tarea	Duracion	% Completado	Comienzo	Terminacion	2010		octubre 1, 2011		octubre 11, 2012		octubre 21, 2013		noviembre 1, 2014		noviembre 11, 2015			
						5/29		11/27		5/27		11/24		5/25		11/23		5/24	
451	Columnas de Concreto	12 días	0%	jue 9/11/14	mar 9/23/14														
452	Losa Estructural	18 días	0%	mar 9/23/14	sáb 10/11/14														
453	<b>Nivel 500</b>	<b>30 días</b>	<b>0%</b>	<b>sáb 10/11/14</b>	<b>lun 11/10/14</b>														
454	Columnas de Concreto	12 días	0%	sáb 10/11/14	jue 10/23/14														
455	Losa Estructural	18 días	0%	jue 10/23/14	lun 11/10/14														
456	<b>Nivel 600</b>	<b>15 días</b>	<b>0%</b>	<b>lun 11/10/14</b>	<b>mar 11/25/14</b>														
457	Columnas de Concreto	5 días	0%	lun 11/10/14	sáb 11/15/14														
458	Losa Estructural	10 días	0%	sáb 11/15/14	mar 11/25/14														
459	<b>Trabajos de Mamposteria</b>	<b>283.36 días</b>	<b>0%</b>	<b>mar 4/1/14</b>	<b>vie 1/9/15</b>														
460	Nivel 100	1 día	0%	mar 4/1/14	mar 4/1/14														
461	<b>Nivel 300</b>	<b>25 días</b>	<b>0%</b>	<b>sáb 10/11/14</b>	<b>mié 11/5/14</b>														
462	Mamposteria	25 días	0%	sáb 10/11/14	mié 11/5/14														
463	<b>Nivel 400</b>	<b>25 días</b>	<b>0%</b>	<b>lun 11/10/14</b>	<b>vie 12/5/14</b>														
464	Mamposteria	25 días	0%	lun 11/10/14	vie 12/5/14														
465	<b>Nivel 500</b>	<b>25 días</b>	<b>0%</b>	<b>vie 12/5/14</b>	<b>mar 12/30/14</b>														
466	Mamposteria	25 días	0%	vie 12/5/14	mar 12/30/14														
467	<b>Nivel 600</b>	<b>10 días</b>	<b>0%</b>	<b>mar 12/30/14</b>	<b>vie 1/9/15</b>														
468	Mamposteria	10 días	0%	mar 12/30/14	vie 1/9/15														
469	<b>Trabajos de Acabados</b>	<b>435.36 días</b>	<b>0%</b>	<b>mar 4/1/14</b>	<b>mié 6/10/15</b>														
470	Nivel 100	1 día	0%	mar 4/1/14	mar 4/1/14														
471	<b>Nivel 300</b>	<b>161 días</b>	<b>0%</b>	<b>mar 11/25/14</b>	<b>mar 5/5/15</b>														
472	Cristaleria y Ventanas	20 días	0%	mar 11/25/14	lun 12/15/14														
473	Puertas y Herrajes (Exteriores)	8 días	0%	lun 12/15/14	mar 12/23/14														
474	Paredes de Yeso	30 días	0%	mar 12/23/14	jue 1/22/15														
475	Puertas y Herrajes (Interiores)	25 días	0%	jue 2/26/15	lun 3/23/15														
476	Cielo Raso	30 días	0%	jue 1/22/15	sáb 2/21/15														
477	Acabados de Piso	35 días	0%	jue 1/22/15	jue 2/26/15														
478	Acabados de Pared (Bano)	18 días	0%	jue 2/26/15	lun 3/16/15														
479	Acessorios de Bano	10 días	0%	lun 3/30/15	jue 4/9/15														
480	Pintura Base & Primera Mano	21 días	0%	sáb 2/21/15	sáb 3/14/15														
481	Pintura Final	16 días	0%	dom 4/19/15	mar 5/5/15														
482	<b>Nivel 400</b>	<b>161 días</b>	<b>0%</b>	<b>lun 12/15/14</b>	<b>lun 5/25/15</b>														
483	Cristaleria y Ventanas	20 días	0%	lun 12/15/14	dom 1/4/15														
484	Puertas y Herrajes (Exteriores)	8 días	0%	dom 1/4/15	lun 1/12/15														
485	Paredes de Yeso	30 días	0%	lun 1/12/15	mié 2/11/15														
486	Puertas y Herrajes (Interiores)	25 días	0%	mié 3/18/15	dom 4/12/15														
487	Cielo Raso	30 días	0%	mié 2/11/15	vie 3/13/15														
488	Acabados de Piso	35 días	0%	mié 2/11/15	mié 3/18/15														
489	Acabados de Pared (Bano)	18 días	0%	mié 3/18/15	dom 4/5/15														
490	Acessorios de Bano	10 días	0%	dom 4/19/15	mié 4/29/15														
491	Pintura Base & Primera Mano	21 días	0%	vie 3/13/15	vie 4/3/15														
492	Pintura Final	16 días	0%	sáb 5/9/15	lun 5/25/15														
493	<b>Nivel 500</b>	<b>143 días</b>	<b>0%</b>	<b>dom 1/4/15</b>	<b>mié 5/27/15</b>														
494	Cristaleria y Ventanas	20 días	0%	dom 1/4/15	sáb 1/24/15														
495	Puertas y Herrajes (Exteriores)	8 días	0%	sáb 1/24/15	dom 2/1/15														
496	Paredes de Yeso	30 días	0%	dom 2/1/15	mar 3/3/15														
497	Puertas y Herrajes (Interiores)	25 días	0%	mar 4/7/15	sáb 5/2/15														
498	Cielo Raso	30 días	0%	mar 3/3/15	jue 4/2/15														
499	Acabados de Piso	35 días	0%	mar 3/3/15	mar 4/7/15														
500	Acabados de Pared (Bano)	18 días	0%	mar 4/7/15	sáb 4/25/15														

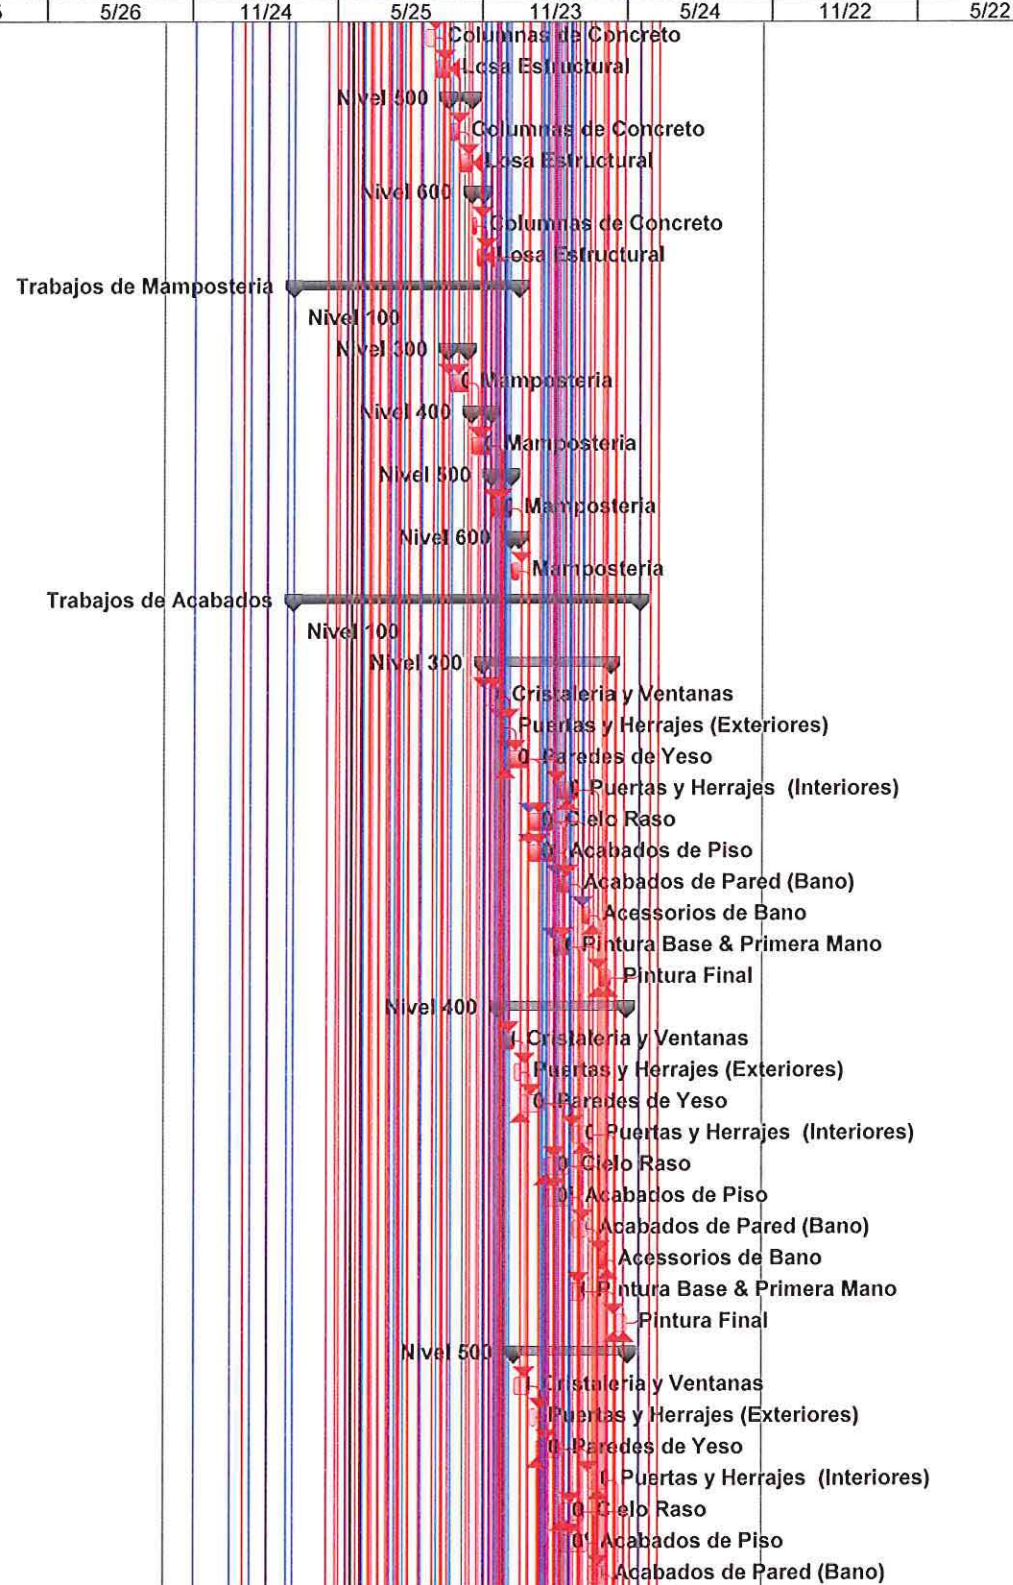


PROYECTO : CIUDAD DE LAS ARTES

TIME IMPACT ANALYSIS #1B

OMEGA ENGINEERING, INC



Id	Tarea	Duracion	% Completado	Comienzo	Terminacion	Gantt Chart Timeline													
						2010	octubre 1, 2011		octubre 11, 2012		octubre 21, 2013		noviembre 1, 2014		noviembre 11, 2015				
						5/29	11/27	5/27	11/25	5/26	11/24	5/25	11/23	5/24	11/22	5/22			
501	Accesorios de Bano	10 días	0%	sáb 5/9/15	mar 5/19/15														
502	Pintura Base & Primera Mano	21 días	0%	jue 4/2/15	jue 4/23/15														
503	Pintura Final	16 días	0%	lun 5/11/15	mié 5/27/15														
504	<b>Nivel 600</b>	<b>137 días</b>	<b>0%</b>	<b>sáb 1/24/15</b>	<b>mié 6/10/15</b>														
505	Cristaleria y Ventanas	18 días	0%	sáb 1/24/15	mié 2/11/15														
506	Puertas y Herrajes (Exteriores)	5 días	0%	mié 2/11/15	lun 2/16/15														
507	Paredes de Yeso	20 días	0%	lun 2/16/15	dom 3/8/15														
508	Puertas y Herrajes (Interiores)	15 días	0%	sáb 3/28/15	dom 4/12/15														
509	Cielo Raso	20 días	0%	dom 3/8/15	sáb 3/28/15														
510	Acabados de Piso	20 días	0%	dom 3/8/15	sáb 3/28/15														
511	Acabados de Pared (Bano)	10 días	0%	sáb 3/28/15	mar 4/7/15														
512	Accesorios de Bano	7 días	0%	mar 5/19/15	mar 5/26/15														
513	Pintura Base & Primera Mano	15 días	0%	sáb 3/28/15	dom 4/12/15														
514	Pintura Final	10 días	0%	dom 5/31/15	mié 6/10/15														
515	<b>Trabajos electricos</b>	<b>445.36 días</b>	<b>0%</b>	<b>mar 4/1/14</b>	<b>sáb 6/20/15</b>														
516	Nivel 100	1 día	0%	mar 4/1/14	mar 4/1/14														
517	<b>Nivel 300</b>	<b>238 días</b>	<b>0%</b>	<b>dom 8/24/14</b>	<b>dom 4/19/15</b>														
518	Equipo de Alarma contra incendio	18 días	0%	mié 4/1/15	dom 4/19/15														
519	Tuberia Electrica Empotrada (Piso)	4 días	0%	dom 8/24/14	jue 8/28/14														
520	Tuberia de electrica	20 días	0%	mié 11/26/14	mar 12/16/14														
521	Tuberia de sistema especiales (Telefono & CCTV)	18 días	0%	mar 12/16/14	sáb 1/3/15														
522	Cableado electrico	18 días	0%	jue 1/22/15	lun 2/9/15														
523	Accesorios de Electricidad y sistema especiales	18 días	0%	sáb 3/14/15	mié 4/1/15														
524	Lamparas	15 días	0%	mié 4/1/15	jue 4/16/15														
525	<b>Nivel 400</b>	<b>228 días</b>	<b>0%</b>	<b>mar 9/23/14</b>	<b>sáb 5/9/15</b>														
526	Equipo de Alarma contra incendio	18 días	0%	mar 4/21/15	sáb 5/9/15														
527	Tuberia Electrica Empotrada (Piso)	4 días	0%	mar 9/23/14	sáb 9/27/14														
528	Tuberia de electrica	20 días	0%	vie 12/26/14	jue 1/15/15														
529	Tuberia de sistema especiales (Telefono & CCTV)	18 días	0%	jue 1/15/15	lun 2/2/15														
530	Cableado electrico	18 días	0%	mié 2/11/15	dom 3/1/15														
531	Accesorios de Electricidad y sistema especiales	18 días	0%	vie 4/3/15	mar 4/21/15														
532	Lamparas	15 días	0%	mar 4/21/15	mié 5/6/15														
533	<b>Nivel 500</b>	<b>233 días</b>	<b>0%</b>	<b>jue 10/23/14</b>	<b>sáb 6/13/15</b>														
534	Equipo de Alarma contra incendio	18 días	0%	lun 5/11/15	vie 5/29/15														
535	Tuberia Electrica Empotrada (Piso)	4 días	0%	jue 10/23/14	lun 10/27/14														
536	Tuberia de electrica	20 días	0%	mar 1/20/15	lun 2/9/15														
537	Tuberia de sistema especiales (Telefono & CCTV)	18 días	0%	lun 2/9/15	vie 2/27/15														
538	Cableado electrico	18 días	0%	mar 3/3/15	sáb 3/21/15														
539	Accesorios de Electricidad y sistema especiales	18 días	0%	jue 4/23/15	lun 5/11/15														
540	Lamparas	15 días	0%	vie 5/29/15	sáb 6/13/15														
541	<b>Nivel 600</b>	<b>217 días</b>	<b>0%</b>	<b>sáb 11/15/14</b>	<b>sáb 6/20/15</b>														
542	Accesorios de Electricidad y sistema especiales	10 días	0%	lun 5/11/15	jue 5/21/15														
543	Lamparas	7 días	0%	sáb 6/13/15	sáb 6/20/15														
544	Equipo de Alarma contra incendio	10 días	0%	jue 5/21/15	dom 5/31/15														
545	Tuberia Electrica Empotrada (Piso)	2 días	0%	sáb 11/15/14	lun 11/17/14														
546	Tuberia de electrica	12 días	0%	lun 2/9/15	sáb 2/21/15														
547	Tuberia de sistema especiales (Telefono & CCTV)	10 días	0%	sáb 2/21/15	mar 3/3/15														
548	Cableado electrico	10 días	0%	sáb 3/21/15	mar 3/31/15														
549	<b>Trabajos plomeria/mecanica</b>	<b>330.88 días</b>	<b>0%</b>	<b>jue 6/12/14</b>	<b>sáb 5/9/15</b>														
550	<b>Nivel 100</b>	<b>36.88 días</b>	<b>0%</b>	<b>jue 6/12/14</b>	<b>sáb 7/19/14</b>														

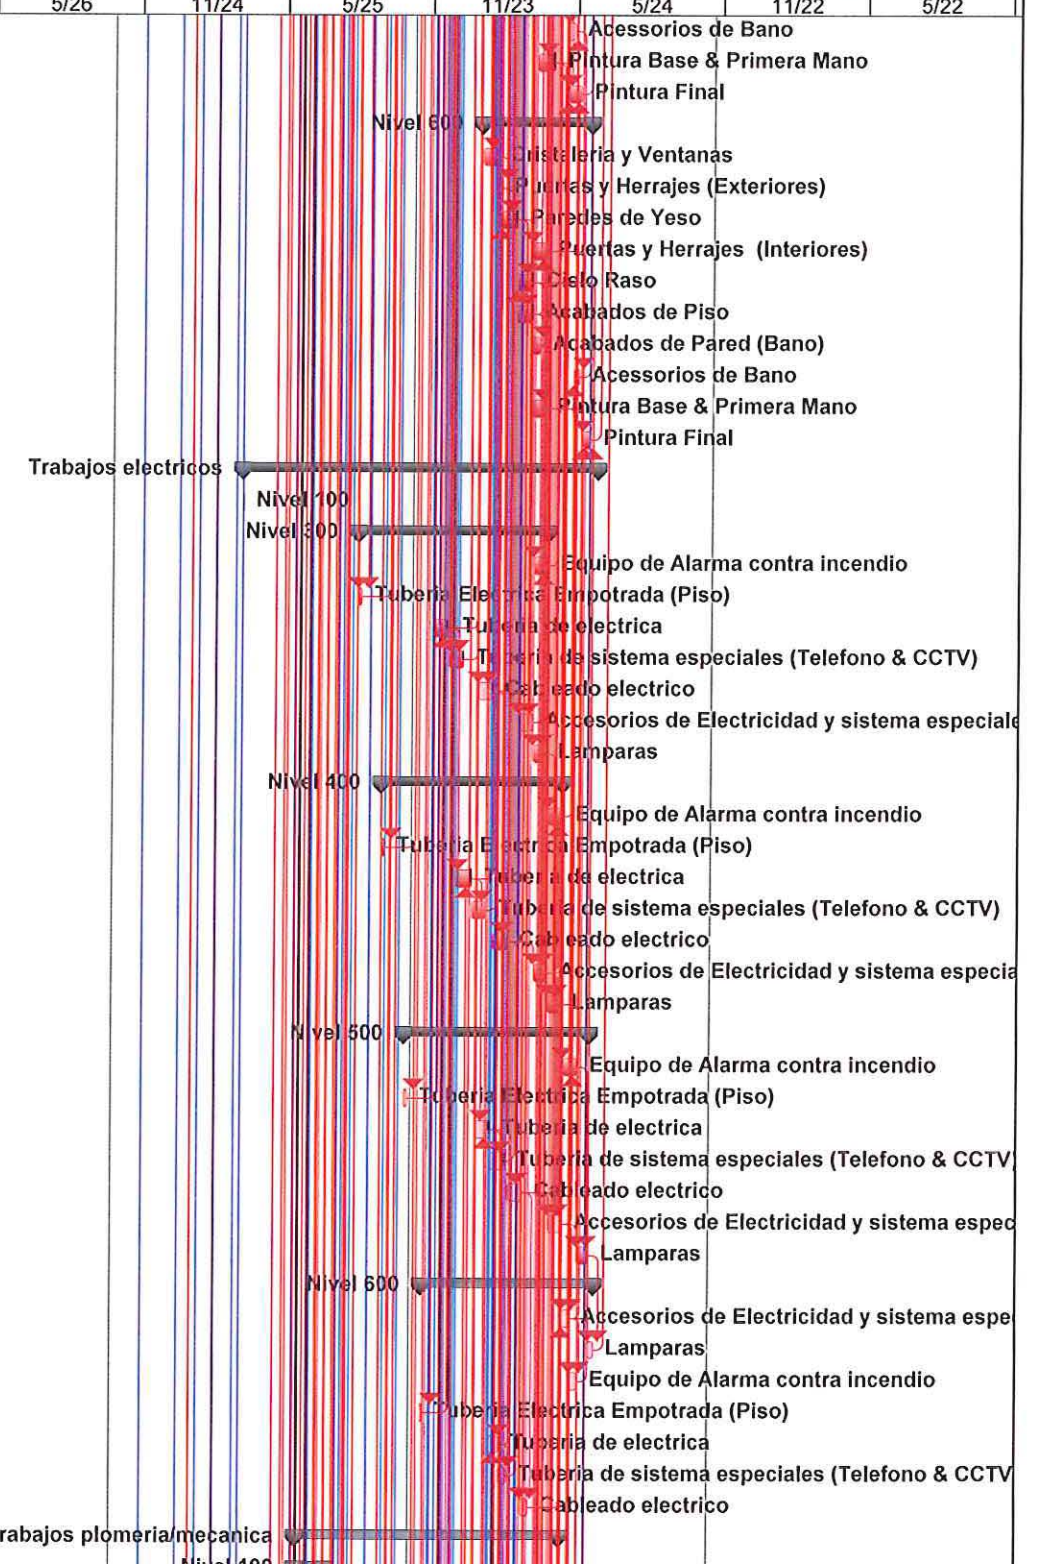


PROYECTO : CIUDAD DE LAS ARTES

TIME IMPACT ANALYSIS #1B

OMEGA ENGINEERING, INC



Id	Tarea	Duracion	% Completado	Comienzo	Terminacion	2010		octubre 1, 2011		octubre 11, 2012		octubre 21, 2013		noviembre 1, 2014		noviembre 11, 2015	
						5/29	11/27	5/27	11/25	5/26	11/24	5/25	11/23	5/24	11/22	5/22	
						Nivel 300		Nivel 400		Nivel 500		Nivel 600		Auditorio		Trabajos estructurales	
551	Tuberia Plomeria Empotrada (Piso)	14 días	0%	jue 6/12/14	jue 6/26/14												
552	Tuberia Plomeria Empotrada (Pared)	14 días	0%	sáb 7/5/14	sáb 7/19/14												
553	<b>Nivel 300</b>	<b>145 días</b>	<b>0%</b>	<b>mié 11/5/14</b>	<b>lun 3/30/15</b>												
554	Ductos de AA	21 días	0%	mié 11/5/14	mié 11/26/14												
555	Tuberia de plomeria	21 días	0%	mié 11/5/14	mié 11/26/14												
556	Tuberia de control contra fuego	18 días	0%	mié 11/26/14	dom 12/14/14												
557	Aparatos Sanitarios	14 días	0%	lun 3/16/15	lun 3/30/15												
558	Rociadores de Fuego	12 días	0%	sáb 2/21/15	jue 3/5/15												
559	Dispositivos de AA	12 días	0%	sáb 2/21/15	jue 3/5/15												
560	<b>Nivel 400</b>	<b>135 días</b>	<b>0%</b>	<b>vie 12/5/14</b>	<b>dom 4/19/15</b>												
561	Ductos de AA	21 días	0%	vie 12/5/14	vie 12/26/14												
562	Tuberia de plomeria	21 días	0%	vie 12/5/14	vie 12/26/14												
563	Tuberia de control contra fuego	18 días	0%	vie 12/26/14	mar 1/13/15												
564	Aparatos Sanitarios	14 días	0%	dom 4/5/15	dom 4/19/15												
565	Rociadores de Fuego	12 días	0%	vie 3/13/15	mié 3/25/15												
566	Dispositivos de AA	12 días	0%	vie 3/13/15	mié 3/25/15												
567	<b>Nivel 500</b>	<b>130 días</b>	<b>0%</b>	<b>mar 12/30/14</b>	<b>sáb 5/9/15</b>												
568	Ductos de AA	21 días	0%	mar 12/30/14	mar 1/20/15												
569	Tuberia de plomeria	21 días	0%	mar 12/30/14	mar 1/20/15												
570	Tuberia de control contra fuego	18 días	0%	mar 1/20/15	sáb 2/7/15												
571	Aparatos Sanitarios	14 días	0%	sáb 4/25/15	sáb 5/9/15												
572	Rociadores de Fuego	12 días	0%	jue 4/2/15	mar 4/14/15												
573	Dispositivos de AA	12 días	0%	jue 4/2/15	mar 4/14/15												
574	<b>Nivel 600</b>	<b>90 días</b>	<b>0%</b>	<b>mar 1/20/15</b>	<b>lun 4/20/15</b>												
575	Aparatos Sanitarios	7 días	0%	mar 4/7/15	mar 4/14/15												
576	Rociadores de Fuego	6 días	0%	mar 4/14/15	lun 4/20/15												
577	Dispositivos de AA	6 días	0%	sáb 3/28/15	vie 4/3/15												
578	Ductos de AA	12 días	0%	mar 1/20/15	dom 2/1/15												
579	Tuberia de plomeria	12 días	0%	mar 1/20/15	dom 2/1/15												
580	Tuberia de control contra fuego	10 días	0%	sáb 2/7/15	mar 2/17/15												
581	<b>Trabajo exterior/techo</b>	<b>113 días</b>	<b>0%</b>	<b>mar 11/25/14</b>	<b>mié 3/18/15</b>												
582	Sistema de Impermeabilizacion	35 días	0%	mar 11/25/14	mar 12/30/14												
583	Sistema de Elevador (2 cu)	40 días	0%	mar 11/25/14	dom 1/4/15												
584	Maquinas de AA	14 días	0%	dom 2/1/15	dom 2/15/15												
585	Pintura Base & Primera Mano (Exterior)	21 días	0%	mié 2/11/15	mié 3/4/15												
586	Pintura Final (Exterior)	14 días	0%	mié 3/4/15	mié 3/18/15												
587	<b>Auditorio</b>	<b>432.88 días</b>	<b>2%</b>	<b>jue 2/6/14</b>	<b>mar 4/14/15</b>												
588	<b>Trabajos estructurales</b>	<b>294.08 días</b>	<b>10%</b>	<b>jue 2/6/14</b>	<b>jue 11/27/14</b>												
589	<b>Almacen &amp; Orquesta</b>	<b>195.04 días</b>	<b>18%</b>	<b>jue 2/6/14</b>	<b>mié 8/20/14</b>												
590	Cimientos & Viga Sismica	30 días	0%	vie 6/6/14	dom 7/6/14												
591	Losa de Piso (Sotano)	7 días	0%	jue 7/10/14	jue 7/17/14												
592	Paredes de Hormigon (Sotano)	10 días	0%	vie 7/18/14	lun 7/28/14												
593	Hinca de Pilotes	14.88 días	100%	jue 2/6/14	jue 2/20/14												
594	Losa Estructural/Losa sobre Tierra	22.4 días	0%	lun 7/28/14	mié 8/20/14												
595	<b>Nivel 100</b>	<b>33.6 días</b>	<b>0%</b>	<b>dom 9/21/14</b>	<b>vie 10/24/14</b>												
596	Columnas de Acero	11.2 días	0%	dom 9/21/14	jue 10/2/14												
597	Vigas de Acero	11.2 días	0%	jue 10/2/14	lun 10/13/14												
598	Techo metalico	5.6 días	0%	lun 10/13/14	sáb 10/18/14												
599	Concreto sobre techo metalico	5.6 días	0%	dom 10/19/14	vie 10/24/14												
600	<b>Nivel 200</b>	<b>33.6 días</b>	<b>0%</b>	<b>vie 10/24/14</b>	<b>jue 11/27/14</b>												

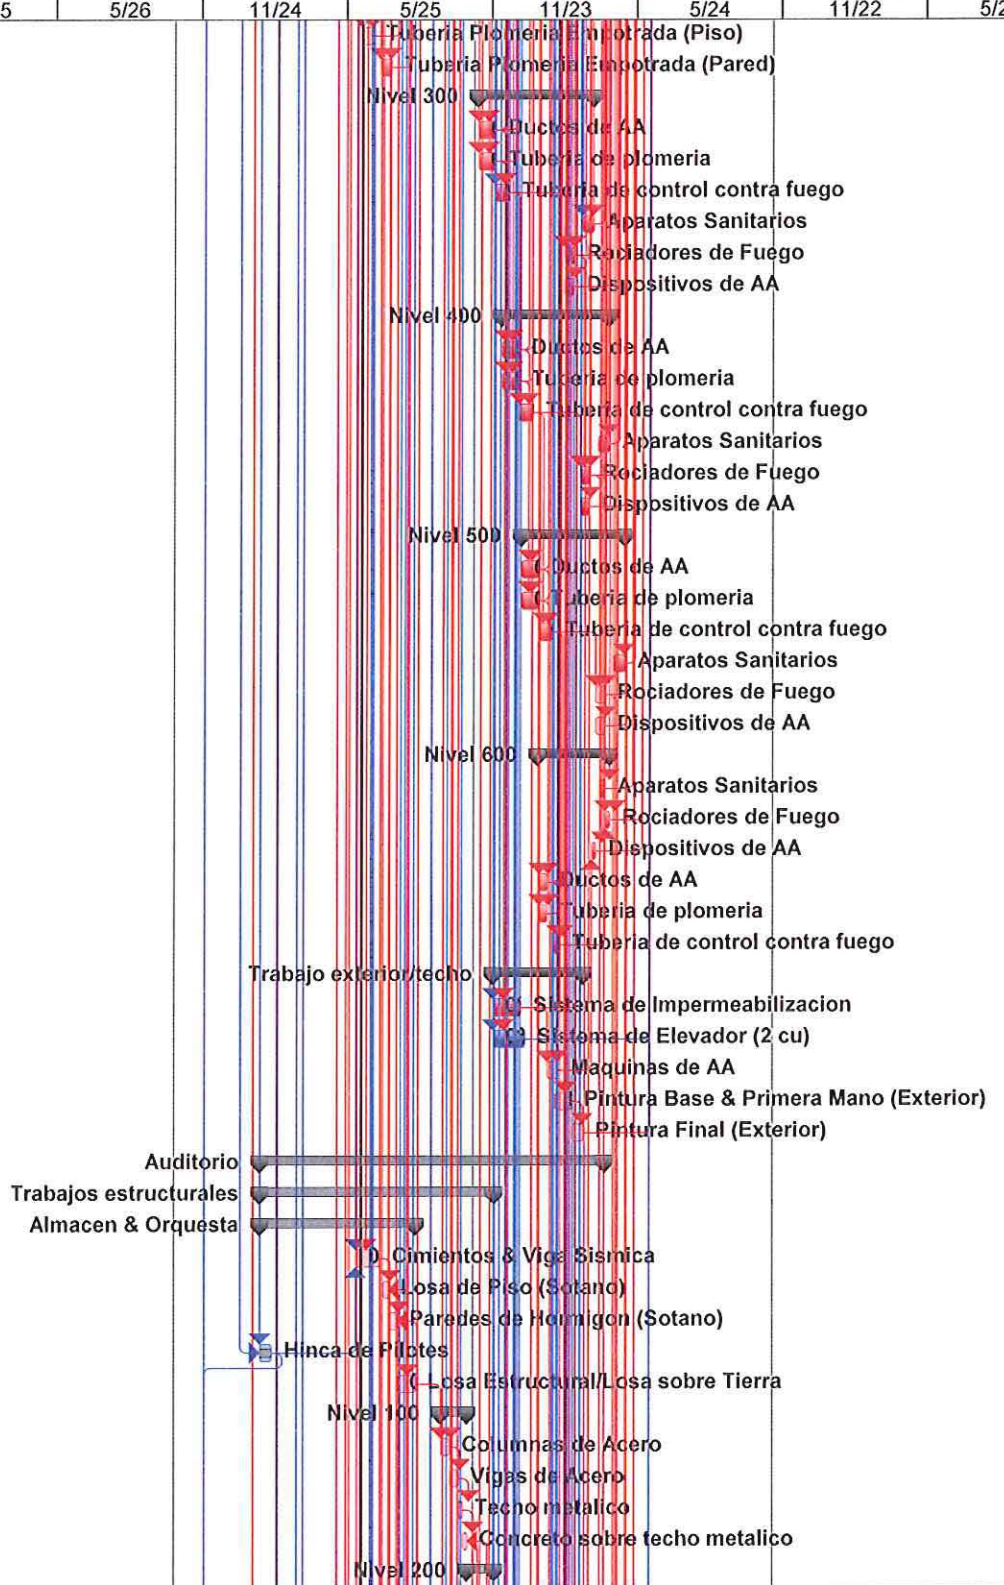

PROYECTO : CIUDAD DE LAS ARTES

TIME IMPACT ANALYSIS #1B

OMEGA ENGINEERING, INC



Id	Tarea	Duracion	% Completado	Comienzo	Terminacion	Gantt Chart Timeline											
						2010	octubre 1, 2011		octubre 11, 2012		octubre 21, 2013		noviembre 1, 2014		noviembre 11, 2015		
						5/29	11/27	5/27	11/25	5/26	11/24	5/25	11/23	5/24	11/22	5/22	
601	Columnas de Acero	11.2 días	0%	vie 10/24/14	mar 11/4/14												
602	Vigas de Acero	11.2 días	0%	mar 11/4/14	sáb 11/15/14												
603	Techo metalico	5.6 días	0%	dom 11/16/14	vie 11/21/14												
604	Concreto sobre techo metalico	5.6 días	0%	vie 11/21/14	jue 11/27/14												
605	<b>Trabajos de Mamposteria</b>	<b>270.2 días</b>	<b>0%</b>	<b>mar 4/1/14</b>	<b>sáb 12/27/14</b>												
606	Almacen & Orquesta	1 día	0%	mar 4/1/14	mar 4/1/14												
607	Nivel 100	15 días	0%	jue 11/27/14	vie 12/12/14												
608	Mamposteria	15 días	0%	jue 11/27/14	vie 12/12/14												
609	Nivel 200	15 días	0%	vie 12/12/14	sáb 12/27/14												
610	Mamposteria	15 días	0%	vie 12/12/14	sáb 12/27/14												
611	<b>Trabajos de Acabados</b>	<b>376 días</b>	<b>0%</b>	<b>mar 4/1/14</b>	<b>sáb 4/11/15</b>												
612	Almacen & Orquesta	1 día	0%	mar 4/1/14	mar 4/1/14												
613	Nivel 100	119 días	0%	jue 11/27/14	jue 3/26/15												
614	Cristaleria y Ventanas	14.4 días	0%	jue 11/27/14	jue 12/11/14												
615	Puertas y Herrerajes (Exteriores)	4 días	0%	jue 12/11/14	lun 12/15/14												
616	Paredes de Yeso	24 días	0%	lun 12/29/14	mié 1/21/15												
617	Puertas y Herrerajes (Interiores)	14.4 días	0%	dom 2/15/15	dom 3/1/15												
618	Cielo Raso	16.8 días	0%	jue 1/22/15	sáb 2/7/15												
619	Acabados de Piso	24 días	0%	jue 1/22/15	sáb 2/14/15												
620	Acabados de Pared (Bano)	11.2 días	0%	dom 2/15/15	jue 2/26/15												
621	Acessorios de Bano	5.6 días	0%	lun 3/9/15	sáb 3/14/15												
622	Pintura Base & Primera Mano	14.4 días	0%	sáb 2/7/15	dom 2/22/15												
623	Pintura Final	9.6 días	0%	lun 3/16/15	jue 3/26/15												
624	Nivel 200	121.4 días	0%	jue 12/11/14	sáb 4/11/15												
625	Cristaleria y Ventanas	14.4 días	0%	jue 12/11/14	jue 12/25/14												
626	Puertas y Herrerajes (Exteriores)	4 días	0%	vie 12/26/14	lun 12/29/14												
627	Paredes de Yeso	24 días	0%	mié 1/14/15	sáb 2/7/15												
628	Puertas y Herrerajes (Interiores)	14.4 días	0%	mar 3/3/15	mié 3/18/15												
629	Cielo Raso	16.8 días	0%	sáb 2/7/15	mar 2/24/15												
630	Acabados de Piso	24 días	0%	sáb 2/7/15	mar 3/3/15												
631	Acabados de Pared (Bano)	11.2 días	0%	mar 3/3/15	sáb 3/14/15												
632	Acessorios de Bano	5.6 días	0%	jue 3/26/15	mar 3/31/15												
633	Pintura Base & Primera Mano	14.4 días	0%	mar 2/24/15	mar 3/10/15												
634	Pintura Final	9.6 días	0%	jue 4/2/15	sáb 4/11/15												
635	<b>Trabajos electricos</b>	<b>258.84 días</b>	<b>0%</b>	<b>jue 7/17/14</b>	<b>jue 4/2/15</b>												
636	Almacen & Orquesta	11.2 días	0%	jue 7/17/14	lun 7/28/14												
637	Tuberia Electrica Empotrada (Pared)	11.2 días	0%	jue 7/17/14	lun 7/28/14												
638	Nivel 100	148.6 días	0%	dom 10/19/14	lun 3/16/15												
639	Tuberia de sistema especiales (Telefono & CCTV)	9.6 días	0%	lun 1/12/15	mié 1/21/15												
640	Tuberia de electrica	14.4 días	0%	lun 12/29/14	lun 1/12/15												
641	Cableado electrico	11.2 días	0%	jue 1/22/15	lun 2/2/15												
642	Acessorios de Electricidad y sistema especiales	11.2 días	0%	dom 2/22/15	jue 3/5/15												
643	Lamparas	9.6 días	0%	jue 3/5/15	sáb 3/14/15												
644	Equipo de Alarma contra incendio	11.2 días	0%	jue 3/5/15	lun 3/16/15												
645	Tuberia Electrica Empotrada (Piso)	3.2 días	0%	dom 10/19/14	mié 10/22/14												
646	Nivel 200	131.8 días	0%	vie 11/21/14	jue 4/2/15												
647	Tuberia de electrica	14.4 días	0%	mié 1/14/15	jue 1/29/15												
648	Tuberia de sistema especiales (Telefono & CCTV)	9.6 días	0%	jue 1/29/15	sáb 2/7/15												
649	Cableado electrico	11.2 días	0%	sáb 2/7/15	mié 2/18/15												
650	Acessorios de Electricidad y sistema especiales	11.2 días	0%	mié 3/11/15	dom 3/22/15												


PROYECTO : CIUDAD DE LAS ARTES

TIME IMPACT ANALYSIS #1B

OMEGA ENGINEERING, INC



Id	Tarea	Duracion	% Completado	Comienzo	Terminacion												
						2010	octubre 1, 2011		octubre 11, 2012		octubre 21, 2013		noviembre 1, 2014		noviembre 11, 2015		
						5/29	11/27	5/27	11/25	5/26	11/24	5/25	11/23	5/24	11/22	5/22	
651	Lamparas	9.6 días	0%	dom 3/22/15	mar 3/31/15											Lamparas	
652	Equipo de Alarma contra incendio	11.2 días	0%	dom 3/22/15	jue 4/2/15											Equipo de Alarma contra incendio	
653	Tuberia Electrica Empotrada (Piso)	3.2 días	0%	vie 11/21/14	lun 11/24/14											Tuberia Electrica Empotrada (Piso)	
654	Trabajos plomeria/mecanica	262.84 días	0%	dom 7/6/14	jue 3/26/15											Trabajos plomeria/mecanica	
655	Almacen & Orquesta	22.4 días	0%	dom 7/6/14	lun 7/28/14											Almacen & Orquesta	
656	Tuberia Plomeria Empotrada (Piso)	11.2 días	0%	dom 7/6/14	jue 7/17/14											Tuberia Plomeria Empotrada (Piso)	
657	Tuberia Plomeria Empotrada (Pared)	11.2 días	0%	jue 7/17/14	lun 7/28/14											Tuberia Plomeria Empotrada (Pared)	
658	Nivel 100	87.2 días	0%	vie 12/12/14	lun 3/9/15											Nivel 100	
659	Aparatos Sanitarios	11.2 días	0%	jue 2/26/15	lun 3/9/15											Aparatos Sanitarios	
660	Rociadores de Fuego	9.6 días	0%	sáb 2/7/15	mar 2/17/15											Rociadores de Fuego	
661	Dispositivos de AA	9.6 días	0%	sáb 2/7/15	mar 2/17/15											Dispositivos de AA	
662	Ductos de AA	16.8 días	0%	vie 12/12/14	dom 12/28/14											Ductos de AA	
663	Tuberia de plomeria	16.8 días	0%	vie 12/12/14	dom 12/28/14											Tuberia de plomeria	
664	Tuberia de control contra fuego	14.4 días	0%	lun 12/29/14	lun 1/12/15											Tuberia de control contra fuego	
665	Nivel 200	87.2 días	0%	lun 12/29/14	jue 3/26/15											Nivel 200	
666	Ductos de AA	16.8 días	0%	lun 12/29/14	mié 1/14/15											Ductos de AA	
667	Tuberia de plomeria	16.8 días	0%	lun 12/29/14	mié 1/14/15											Tuberia de plomeria	
668	Tuberia de control contra fuego	14.4 días	0%	mié 1/14/15	jue 1/29/15											Tuberia de control contra fuego	
669	Aparatos Sanitarios	11.2 días	0%	dom 3/15/15	jue 3/26/15											Aparatos Sanitarios	
670	Rociadores de Fuego	9.6 días	0%	mar 2/24/15	vie 3/6/15											Rociadores de Fuego	
671	Dispositivos de AA	9.6 días	0%	mar 2/24/15	vie 3/6/15											Dispositivos de AA	
672	Trabajo exterior/techo	138.8 días	0%	jue 11/27/14	mar 4/14/15											Trabajo exterior/techo	
673	Maquinas de AA	11.2 días	0%	mié 1/14/15	dom 1/25/15											Maquinas de AA	
674	Sistema de Impermeabilizacion	24 días	0%	jue 11/27/14	dom 12/21/14											Sistema de Impermeabilizacion	
675	Pintura Base & Primera Mano (Exterior)	21 días	0%	mié 3/11/15	mar 3/31/15											Pintura Base & Primera Mano (Exterior)	
676	Pintura Final (Exterior)	14 días	0%	mié 4/1/15	mar 4/14/15											Pintura Final (Exterior)	
677	Edificio de la Escuela de Artes Plasticas	427.88 días	2%	lun 12/23/13	lun 2/23/15											Edificio de la Escuela de Artes Plasticas	
678	Trabajos estructurales	279.08 días	14%	lun 12/23/13	dom 9/28/14											Trabajos estructurales	
679	Estacionamiento	179.08 días	26%	lun 12/23/13	vie 6/20/14											Estacionamiento	
680	Cimientos & Vega Sismica	21 días	0%	mar 4/1/14	lun 4/21/14											Cimientos & Vega Sismica	
681	Losa de Piso	16.8 días	0%	mar 4/22/14	jue 5/8/14											Losa de Piso	
682	Paredes de Hormigon	20 días	0%	jue 5/8/14	mié 5/28/14											Paredes de Hormigon	
683	Hinca de Pilotes	28.6 días	100%	lun 12/23/13	vie 3/21/14											Hinca de Pilotes	
684	Losa Estructural	22.4 días	0%	mié 5/28/14	vie 6/20/14											Losa Estructural	
685	Nivel 100	25 días	0%	vie 6/20/14	mar 7/15/14											Nivel 100	
686	Columnas de Concreto	10 días	0%	vie 6/20/14	lun 6/30/14											Columnas de Concreto	
687	Losa Estructural	15 días	0%	lun 6/30/14	mar 7/15/14											Losa Estructural	
688	Nivel 200	25 días	0%	mar 7/15/14	sáb 8/9/14											Nivel 200	
689	Columnas de Concreto	10 días	0%	mar 7/15/14	vie 7/25/14											Columnas de Concreto	
690	Losa Estructural	15 días	0%	vie 7/25/14	sáb 8/9/14											Losa Estructural	
691	Nivel 300	25 días	0%	sáb 8/9/14	mié 9/3/14											Nivel 300	
692	Columnas de Concreto	10 días	0%	sáb 8/9/14	mar 8/19/14											Columnas de Concreto	
693	Losa Estructural	15 días	0%	mar 8/19/14	mié 9/3/14											Losa Estructural	
694	Nivel 400	25 días	0%	mié 9/3/14	dom 9/28/14											Nivel 400	
695	Columnas de Concreto	10 días	0%	mié 9/3/14	sáb 9/13/14											Columnas de Concreto	
696	Losa Estructural	15 días	0%	sáb 9/13/14	dom 9/28/14											Losa Estructural	
697	Trabajos de Mamposteria	208.2 días	0%	mar 4/1/14	dom 10/26/14											Trabajos de Mamposteria	
698	Estacionamiento	1 día	0%	mar 4/1/14	mar 4/1/14											Estacionamiento	
699	Nivel 100	14 días	0%	sáb 8/9/14	sáb 8/23/14											Nivel 100	
700	Mamposteria	14 días	0%	sáb 8/9/14	sáb 8/23/14											Mamposteria	

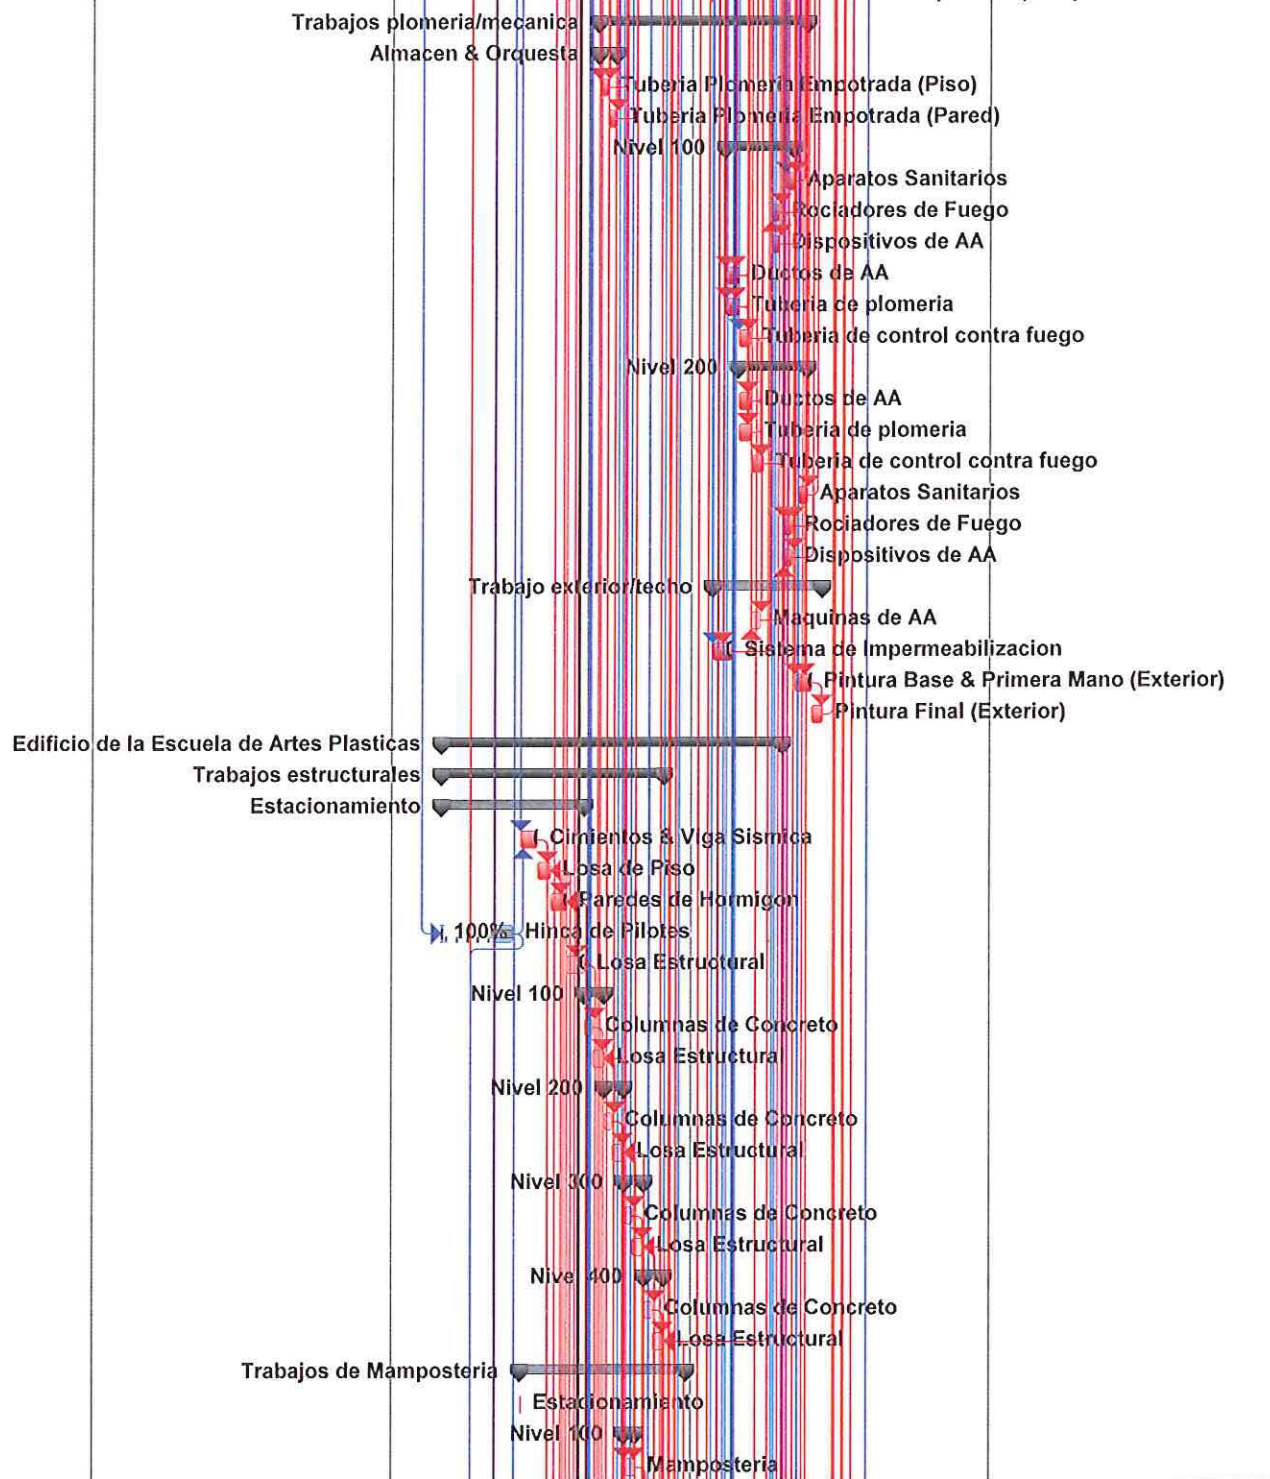

Id	Tarea	Duracion	% Completado	Comienzo	Terminacion	Gantt Chart											
						2010	octubre 1, 2011		octubre 11, 2012		octubre 21, 2013		noviembre 1, 2014		noviembre 11, 2015		
						5/29	11/27	5/27	11/25	5/26	11/24	5/25	11/23	5/24	11/22	5/22	
701	Nivel 200	14 días	0%	mié 9/3/14	mié 9/17/14												
702	Mampostería	14 días	0%	mié 9/3/14	mié 9/17/14												
703	Nivel 300	14 días	0%	dom 9/28/14	dom 10/12/14												
704	Mampostería	14 días	0%	dom 9/28/14	dom 10/12/14												
705	Nivel 400	14 días	0%	dom 10/12/14	dom 10/26/14												
706	Mampostería	14 días	0%	dom 10/12/14	dom 10/26/14												
707	Trabajos de Acabados	148.8 días	0%	dom 9/28/14	lun 2/23/15												
708	Estacionamiento	5.6 días	0%	dom 9/28/14	vie 10/3/14												
709	Marcado de Pavimento y Rotulacion	5.6 días	0%	dom 9/28/14	vie 10/3/14												
710	Nivel 100	105.6 días	0%	dom 9/28/14	dom 1/11/15												
711	Cristalería y Ventanas	14.4 días	0%	dom 9/28/14	dom 10/12/14												
712	Puertas y Herrerajes (Exteriores)	4 días	0%	dom 10/12/14	jue 10/16/14												
713	Paredes de Yeso	24 días	0%	jue 10/16/14	dom 11/9/14												
714	Puertas y Herrerajes (Interiores)	14.4 días	0%	mié 12/3/14	mié 12/17/14												
715	Cielo Raso	16.8 días	0%	dom 11/9/14	mié 11/26/14												
716	Acabados de Piso	24 días	0%	dom 11/9/14	mié 12/3/14												
717	Acabados de Pared (Bano)	11.2 días	0%	mié 12/3/14	dom 12/14/14												
718	Acessorios de Bano	5.6 días	0%	vie 12/26/14	mié 12/31/14												
719	Pintura Base & Primera Mano	14.4 días	0%	mié 11/26/14	mié 12/10/14												
720	Pintura Final	9.6 días	0%	vie 1/2/15	dom 1/11/15												
721	Nivel 200	105.6 días	0%	dom 10/12/14	lun 1/26/15												
722	Cristalería y Ventanas	14.4 días	0%	dom 10/12/14	dom 10/26/14												
723	Puertas y Herrerajes (Exteriores)	4 días	0%	lun 10/27/14	jue 10/30/14												
724	Paredes de Yeso	24 días	0%	vie 10/31/14	dom 11/23/14												
725	Puertas y Herrerajes (Interiores)	14.4 días	0%	jue 12/18/14	jue 1/1/15												
726	Cielo Raso	16.8 días	0%	lun 11/24/14	mié 12/10/14												
727	Acabados de Piso	24 días	0%	lun 11/24/14	mié 12/17/14												
728	Acabados de Pared (Bano)	11.2 días	0%	jue 12/18/14	lun 12/29/14												
729	Acessorios de Bano	5.6 días	0%	vie 1/9/15	mié 1/14/15												
730	Pintura Base & Primera Mano	14.4 días	0%	mié 12/10/14	jue 12/25/14												
731	Pintura Final	9.6 días	0%	vie 1/16/15	lun 1/26/15												
732	Nivel 300	105.6 días	0%	lun 10/27/14	lun 2/9/15												
733	Cristalería y Ventanas	14.4 días	0%	lun 10/27/14	lun 11/10/14												
734	Puertas y Herrerajes (Exteriores)	4 días	0%	lun 11/10/14	vie 11/14/14												
735	Paredes de Yeso	24 días	0%	vie 11/14/14	lun 12/8/14												
736	Puertas y Herrerajes (Interiores)	14.4 días	0%	jue 1/1/15	jue 1/15/15												
737	Cielo Raso	16.8 días	0%	lun 12/8/14	jue 12/25/14												
738	Acabados de Piso	24 días	0%	lun 12/8/14	jue 1/1/15												
739	Acabados de Pared (Bano)	11.2 días	0%	jue 1/1/15	lun 1/12/15												
740	Acessorios de Bano	5.6 días	0%	vie 1/23/15	jue 1/29/15												
741	Pintura Base & Primera Mano	14.4 días	0%	jue 12/25/14	jue 1/8/15												
742	Pintura Final	9.6 días	0%	sáb 1/31/15	lun 2/9/15												
743	Nivel 400	105.6 días	0%	lun 11/10/14	lun 2/23/15												
744	Cristalería y Ventanas	14.4 días	0%	lun 11/10/14	lun 11/24/14												
745	Puertas y Herrerajes (Exteriores)	4 días	0%	lun 11/24/14	vie 11/28/14												
746	Paredes de Yeso	24 días	0%	vie 11/28/14	lun 12/22/14												
747	Puertas y Herrerajes (Interiores)	14.4 días	0%	jue 1/15/15	vie 1/30/15												
748	Cielo Raso	16.8 días	0%	lun 12/22/14	jue 1/8/15												
749	Acabados de Piso	24 días	0%	lun 12/22/14	jue 1/15/15												
750	Acabados de Pared (Bano)	11.2 días	0%	jue 1/15/15	lun 1/26/15												

PROYECTO : CIUDAD DE LAS ARTES

TIME IMPACT ANALYSIS #1B

OMEGA ENGINEERING, INC





Id	Tarea	Duracion	% Completado	Comienzo	Terminacion	2010	octubre 1, 2011		octubre 11, 2012		octubre 21, 2013		noviembre 1, 2014		noviembre 11, 2015	
						5/29	11/27	5/27	11/25	5/26	11/24	5/25	11/23	5/24	11/22	5/22
801	Nivel 200	114.2 días	0%	mié 9/17/14	vie 1/9/15											
802	Ductos de AA	16.8 días	0%	mié 9/17/14	vie 10/3/14											
803	Tubería de plomería	16.8 días	0%	mié 9/17/14	vie 10/3/14											
804	Tubería de control contra fuego	14.4 días	0%	sáb 10/4/14	sáb 10/18/14											
805	Aparatos Sanitarios	11.2 días	0%	lun 12/29/14	vie 1/9/15											
806	Rociadores de Fuego	9.6 días	0%	mié 12/10/14	sáb 12/20/14											
807	Dispositivos de AA	9.6 días	0%	mié 12/10/14	sáb 12/20/14											
808	Nivel 300	103.6 días	0%	dom 10/12/14	vie 1/23/15											
809	Ductos de AA	16.8 días	0%	dom 10/12/14	mar 10/28/14											
810	Tubería de plomería	16.8 días	0%	dom 10/12/14	mar 10/28/14											
811	Tubería de control contra fuego	14.4 días	0%	mié 10/29/14	mié 11/12/14											
812	Aparatos Sanitarios	11.2 días	0%	lun 1/12/15	vie 1/23/15											
813	Rociadores de Fuego	9.6 días	0%	jue 12/25/14	sáb 1/3/15											
814	Dispositivos de AA	9.6 días	0%	jue 12/25/14	sáb 1/3/15											
815	Nivel 400	101.2 días	0%	mié 10/29/14	sáb 2/7/15											
816	Ductos de AA	16.8 días	0%	mié 10/29/14	vie 11/14/14											
817	Tubería de plomería	16.8 días	0%	mié 10/29/14	vie 11/14/14											
818	Tubería de control contra fuego	14.4 días	0%	vie 11/14/14	sáb 11/29/14											
819	Rociadores de Fuego	9.6 días	0%	jue 1/8/15	dom 1/18/15											
820	Aparatos Sanitarios	11.2 días	0%	mar 1/27/15	sáb 2/7/15											
821	Dispositivos de AA	9.6 días	0%	jue 1/8/15	dom 1/18/15											
822	Trabajo exterior/techo	92.6 días	0%	dom 9/28/14	lun 12/29/14											
823	Maquinas de AA	11.2 días	0%	vie 11/14/14	mar 11/25/14											
824	Sistema de Impermeabilizacion	24 días	0%	dom 9/28/14	mié 10/22/14											
825	Pintura Base & Primera Mano (Exterior)	21 días	0%	lun 11/24/14	lun 12/15/14											
826	Pintura Final (Exterior)	14 días	0%	lun 12/15/14	lun 12/29/14											
827	Edificio de Estacionamiento	382.98 días	3%	sáb 2/22/14	jue 3/12/15											
828	Trabajos estructurales	347.98 días	6%	sáb 2/22/14	jue 2/5/15											
829	Nivel 000	159.98 días	18%	sáb 2/22/14	vie 8/1/14											
830	Cimientos & Viga Sismica	20 días	12%	lun 3/24/14	sáb 5/24/14											
831	Losa de Piso	14 días	0%	sáb 5/24/14	sáb 6/7/14											
832	Paredes de Hormigon	18 días	0%	mar 6/24/14	sáb 7/12/14											
833	Hinca de Pilotes	13 días	100%	sáb 2/22/14	sáb 3/22/14											
834	Losa Estructural	20 días	0%	sáb 7/12/14	vie 8/1/14											
835	Nivel 100	36 días	0%	vie 8/1/14	sáb 9/6/14											
836	Paredes de Hormigon	16 días	0%	vie 8/1/14	dom 8/17/14											
837	Losa Estructural	20 días	0%	dom 8/17/14	sáb 9/6/14											
838	Nivel 200	36 días	0%	sáb 9/6/14	dom 10/12/14											
839	Paredes de Hormigon	16 días	0%	sáb 9/6/14	lun 9/22/14											
840	Losa Estructural	20 días	0%	lun 9/22/14	dom 10/12/14											
841	Nivel 300	36 días	0%	dom 10/12/14	lun 11/17/14											
842	Paredes de Hormigon	16 días	0%	dom 10/12/14	mar 10/28/14											
843	Losa Estructural	20 días	0%	mar 10/28/14	lun 11/17/14											
844	Nivel 400	36 días	0%	lun 11/17/14	mar 12/23/14											
845	Paredes de Hormigon	16 días	0%	lun 11/17/14	mié 12/3/14											
846	Losa Estructural	20 días	0%	mié 12/3/14	mar 12/23/14											
847	Nivel 500	36 días	0%	mar 12/23/14	mié 1/28/15											
848	Paredes de Hormigon	16 días	0%	mar 12/23/14	jue 1/8/15											
849	Losa Estructural	20 días	0%	jue 1/8/15	mié 1/28/15											
850	Nivel 600	8 días	0%	mié 1/28/15	jue 2/5/15											

PROYECTO : CIUDAD DE LAS ARTES

TIME IMPACT ANALYSIS #1B

OMEGA ENGINEERING, INC





Id	Tarea	Duracion	% Completado	Comienzo	Terminacion	Gantt Chart											
						2010		octubre 1, 2011		octubre 11, 2012		octubre 21, 2013		noviembre 1, 2014		noviembre 11, 2015	
						5/29	11/27	5/27	11/25	5/26	11/24	5/25	11/23	5/24	11/22	5/22	
851	Paredes de Hormigon	8 días	0%	mié 1/28/15	jue 2/5/15	Paredes de Hormigon											
852	Trabajos de Mamposteria	1 día	0%	mar 4/1/14	mar 4/1/14	Trabajos de Mamposteria											
853	Nivel 000	1 día	0%	mar 4/1/14	mar 4/1/14	Nivel 000											
854	Nivel 100	1 día	0%	mar 4/1/14	mar 4/1/14	Nivel 100											
855	Nivel 200	1 día	0%	mar 4/1/14	mar 4/1/14	Nivel 200											
856	Nivel 300	1 día	0%	mar 4/1/14	mar 4/1/14	Nivel 300											
857	Nivel 400	1 día	0%	mar 4/1/14	mar 4/1/14	Nivel 400											
858	Nivel 500	1 día	0%	mar 4/1/14	mar 4/1/14	Nivel 500											
859	Nivel 600	1 día	0%	mar 4/1/14	mar 4/1/14	Nivel 600											
860	Trabajos de Acabados	190.4 días	0%	mié 8/6/14	vie 2/13/15	Trabajos de Acabados											
861	Nivel 000	5.6 días	0%	mié 8/6/14	mar 8/12/14	Nivel 000											
862	Marcado de Pavimento y Rotulacion	5.6 días	0%	mié 8/6/14	mar 8/12/14	Marcado de Pavimento y Rotulacion											
863	Nivel 100	5.6 días	0%	vie 9/12/14	mié 9/17/14	Nivel 100											
864	Marcado de Pavimento y Rotulacion	5.6 días	0%	vie 9/12/14	mié 9/17/14	Marcado de Pavimento y Rotulacion											
865	Nivel 200	5.6 días	0%	sáb 10/18/14	jue 10/23/14	Nivel 200											
866	Marcado de Pavimento y Rotulacion	5.6 días	0%	sáb 10/18/14	jue 10/23/14	Marcado de Pavimento y Rotulacion											
867	Nivel 300	5.6 días	0%	dom 11/23/14	vie 11/28/14	Nivel 300											
868	Marcado de Pavimento y Rotulacion	5.6 días	0%	dom 11/23/14	vie 11/28/14	Marcado de Pavimento y Rotulacion											
869	Nivel 400	5.6 días	0%	lun 12/29/14	sáb 1/3/15	Nivel 400											
870	Marcado de Pavimento y Rotulacion	5.6 días	0%	lun 12/29/14	sáb 1/3/15	Marcado de Pavimento y Rotulacion											
871	Nivel 500	5.6 días	0%	mar 2/3/15	dom 2/8/15	Nivel 500											
872	Marcado de Pavimento y Rotulacion	5.6 días	0%	mar 2/3/15	dom 2/8/15	Marcado de Pavimento y Rotulacion											
873	Nivel 600	4 días	0%	lun 2/9/15	vie 2/13/15	Nivel 600											
874	Marcado de Pavimento y Rotulacion	4 días	0%	lun 2/9/15	vie 2/13/15	Marcado de Pavimento y Rotulacion											
875	Trabajos electricos	240.38 días	0%	sáb 6/7/14	mar 2/3/15	Trabajos electricos											
876	Nivel 000	11.2 días	0%	sáb 6/7/14	mié 6/18/14	Nivel 000											
877	Tuberia Electrica Empotrada (Pared)	11.2 días	0%	sáb 6/7/14	mié 6/18/14	Tuberia Electrica Empotrada (Pared)											
878	Nivel 100	11.2 días	0%	vie 8/1/14	mar 8/12/14	Nivel 100											
879	Tuberia Electrica Empotrada (Pared)	11.2 días	0%	vie 8/1/14	mar 8/12/14	Tuberia Electrica Empotrada (Pared)											
880	Nivel 200	11.2 días	0%	sáb 9/6/14	mié 9/17/14	Nivel 200											
881	Tuberia Electrica Empotrada (Pared)	11.2 días	0%	sáb 9/6/14	mié 9/17/14	Tuberia Electrica Empotrada (Pared)											
882	Nivel 300	11.2 días	0%	dom 10/12/14	jue 10/23/14	Nivel 300											
883	Tuberia Electrica Empotrada (Pared)	11.2 días	0%	dom 10/12/14	jue 10/23/14	Tuberia Electrica Empotrada (Pared)											
884	Nivel 400	11.2 días	0%	lun 11/17/14	vie 11/28/14	Nivel 400											
885	Tuberia Electrica Empotrada (Pared)	11.2 días	0%	lun 11/17/14	vie 11/28/14	Tuberia Electrica Empotrada (Pared)											
886	Nivel 500	11.2 días	0%	mar 12/23/14	sáb 1/3/15	Nivel 500											
887	Tuberia Electrica Empotrada (Pared)	11.2 días	0%	mar 12/23/14	sáb 1/3/15	Tuberia Electrica Empotrada (Pared)											
888	Nivel 600	6 días	0%	mié 1/28/15	mar 2/3/15	Nivel 600											
889	Tuberia Electrica Empotrada (Pared)	6 días	0%	mié 1/28/15	mar 2/3/15	Tuberia Electrica Empotrada (Pared)											
890	Trabajos plomeria/mecanica	260.38 días	0%	sáb 5/24/14	lun 2/9/15	Trabajos plomeria/mecanica											
891	Nivel 000	73.98 días	0%	sáb 5/24/14	mié 8/6/14	Nivel 000											
892	Tuberia de control contra fuego	5.6 días	0%	vie 8/1/14	mié 8/6/14	Tuberia de control contra fuego											
893	Tuberia Plomeria Empotrada (Piso)	11.2 días	0%	sáb 5/24/14	mié 6/4/14	Tuberia Plomeria Empotrada (Piso)											
894	Tuberia Plomeria Empotrada (Pared)	11.2 días	0%	sáb 6/7/14	mié 6/18/14	Tuberia Plomeria Empotrada (Pared)											
895	Nivel 100	42 días	0%	vie 8/1/14	vie 9/12/14	Nivel 100											
896	Tuberia de control contra fuego	6 días	0%	sáb 9/6/14	vie 9/12/14	Tuberia de control contra fuego											
897	Tuberia Plomeria Empotrada (Pared)	11 días	0%	vie 8/1/14	mar 8/12/14	Tuberia Plomeria Empotrada (Pared)											
898	Nivel 200	42 días	0%	sáb 9/6/14	sáb 10/18/14	Nivel 200											
899	Tuberia de control contra fuego	6 días	0%	dom 10/12/14	sáb 10/18/14	Tuberia de control contra fuego											
900	Tuberia Plomeria Empotrada (Pared)	11 días	0%	sáb 9/6/14	mié 9/17/14	Tuberia Plomeria Empotrada (Pared)											


PROYECTO : CIUDAD DE LAS ARTES

TIME IMPACT ANALYSIS #1B

OMEGA ENGINEERING, INC



Id	Tarea	Duracion	% Completado	Comienzo	Terminacion	Gantt Chart											
						2010	octubre 1, 2011		octubre 11, 2012		octubre 21, 2013		noviembre 1, 2014		noviembre 11, 2015		
						5/29	11/27	5/27	11/25	5/26	11/24	5/25	11/23	5/24	11/22	5/22	
901	Nivel 300	42 días	0%	dom 10/12/14	dom 11/23/14												
902	Tuberia de control contra fuego	6 días	0%	lun 11/17/14	dom 11/23/14												
903	Tuberia Plomeria Empotrada (Pared)	11 días	0%	dom 10/12/14	jue 10/23/14												
904	Nivel 400	42 días	0%	lun 11/17/14	lun 12/29/14												
905	Tuberia de control contra fuego	6 días	0%	mar 12/23/14	lun 12/29/14												
906	Tuberia Plomeria Empotrada (Pared)	11 días	0%	lun 11/17/14	vie 11/28/14												
907	Nivel 500	42 días	0%	mar 12/23/14	mar 2/3/15												
908	Tuberia de control contra fuego	6 días	0%	mié 1/28/15	mar 2/3/15												
909	Tuberia Plomeria Empotrada (Pared)	11 días	0%	mar 12/23/14	sáb 1/3/15												
910	Nivel 600	12 días	0%	mié 1/28/15	lun 2/9/15												
911	Tuberia de control contra fuego	4 días	0%	jue 2/5/15	lun 2/9/15												
912	Tuberia Plomeria Empotrada (Pared)	6 días	0%	mié 1/28/15	mar 2/3/15												
913	Trabajo exterior/techo	35 días	0%	jue 2/5/15	jue 3/12/15												
914	Sistema de Elevador (1)	30 días	0%	jue 2/5/15	sáb 3/7/15												
915	Pintura Base & Primera Mano (Exterior)	21 días	0%	jue 2/5/15	jue 2/26/15												
916	Pintura Final (Exterior)	14 días	0%	jue 2/26/15	jue 3/12/15												
917	Edificio Reina Torres de Arauz (Remodelacion)	402.8 días	0%	mar 4/1/14	vie 5/8/15												
918	Trabajos estructurales	266.8 días	0%	mar 4/1/14	mar 12/23/14												
919	Nivel 100	32.2 días	0%	vie 11/21/14	mar 12/23/14												
920	Estructura de Mezzanine	21 días	0%	vie 11/21/14	vie 12/12/14												
921	Techo Metalico (Mezzanine)	11.2 días	0%	vie 12/12/14	mar 12/23/14												
922	Nivel 200	1 día	0%	mar 4/1/14	mar 4/1/14												
923	Trabajos de Mamposteria	36 días	0%	dom 7/27/14	lun 9/1/14												
924	Nivel 100	15 días	0%	dom 7/27/14	lun 8/11/14												
925	Mamposteria	15 días	0%	dom 7/27/14	lun 8/11/14												
926	Nivel 200	15 días	0%	dom 8/17/14	lun 9/1/14												
927	Mamposteria	15 días	0%	dom 8/17/14	lun 9/1/14												
928	Trabajos de Acabados	229.8 días	0%	dom 9/21/14	vie 5/8/15												
929	Nivel 100	201.8 días	0%	dom 9/21/14	vie 4/10/15												
930	Ventanas	14.4 días	0%	dom 9/21/14	dom 10/5/14												
931	Puertas y Herrajes (Exteriores)	4 días	0%	dom 10/5/14	jue 10/9/14												
932	Paredes de Yeso	28 días	0%	mar 12/23/14	mar 1/20/15												
933	Puertas y Herrajes (Interiores)	18 días	0%	mar 2/17/15	sáb 3/7/15												
934	Cielo Raso	20 días	0%	mar 1/20/15	lun 2/9/15												
935	Acabados de Piso	28 días	0%	mar 1/20/15	mar 2/17/15												
936	Acabados de Pared (Bano)	11.2 días	0%	mar 2/17/15	sáb 2/28/15												
937	Accesorios de Bano	5.6 días	0%	dom 3/15/15	vie 3/20/15												
938	Pintura Base & Primera Mano	14.4 días	0%	lun 2/9/15	mar 2/24/15												
939	Pintura Final	9.6 días	0%	mié 4/1/15	vie 4/10/15												
940	Nivel 200	215.4 días	0%	dom 10/5/14	vie 5/8/15												
941	Ventanas	14.4 días	0%	dom 10/5/14	dom 10/19/14												
942	Puertas y Herrajes (Exteriores)	4 días	0%	dom 10/19/14	jue 10/23/14												
943	Paredes de Yeso	28 días	0%	mar 1/20/15	mar 2/17/15												
944	Puertas y Herrajes (Interiores)	18 días	0%	mar 3/17/15	sáb 4/4/15												
945	Cielo Raso	20 días	0%	mar 2/17/15	lun 3/9/15												
946	Acabados de Piso	28 días	0%	mar 2/17/15	mar 3/17/15												
947	Acabados de Pared (Bano)	11.2 días	0%	mar 3/17/15	sáb 3/28/15												
948	Accesorios de Bano	5.6 días	0%	dom 4/12/15	vie 4/17/15												
949	Pintura Base & Primera Mano	14.4 días	0%	lun 3/9/15	mar 3/24/15												
950	Pintura Final	9.6 días	0%	mié 4/29/15	vie 5/8/15												

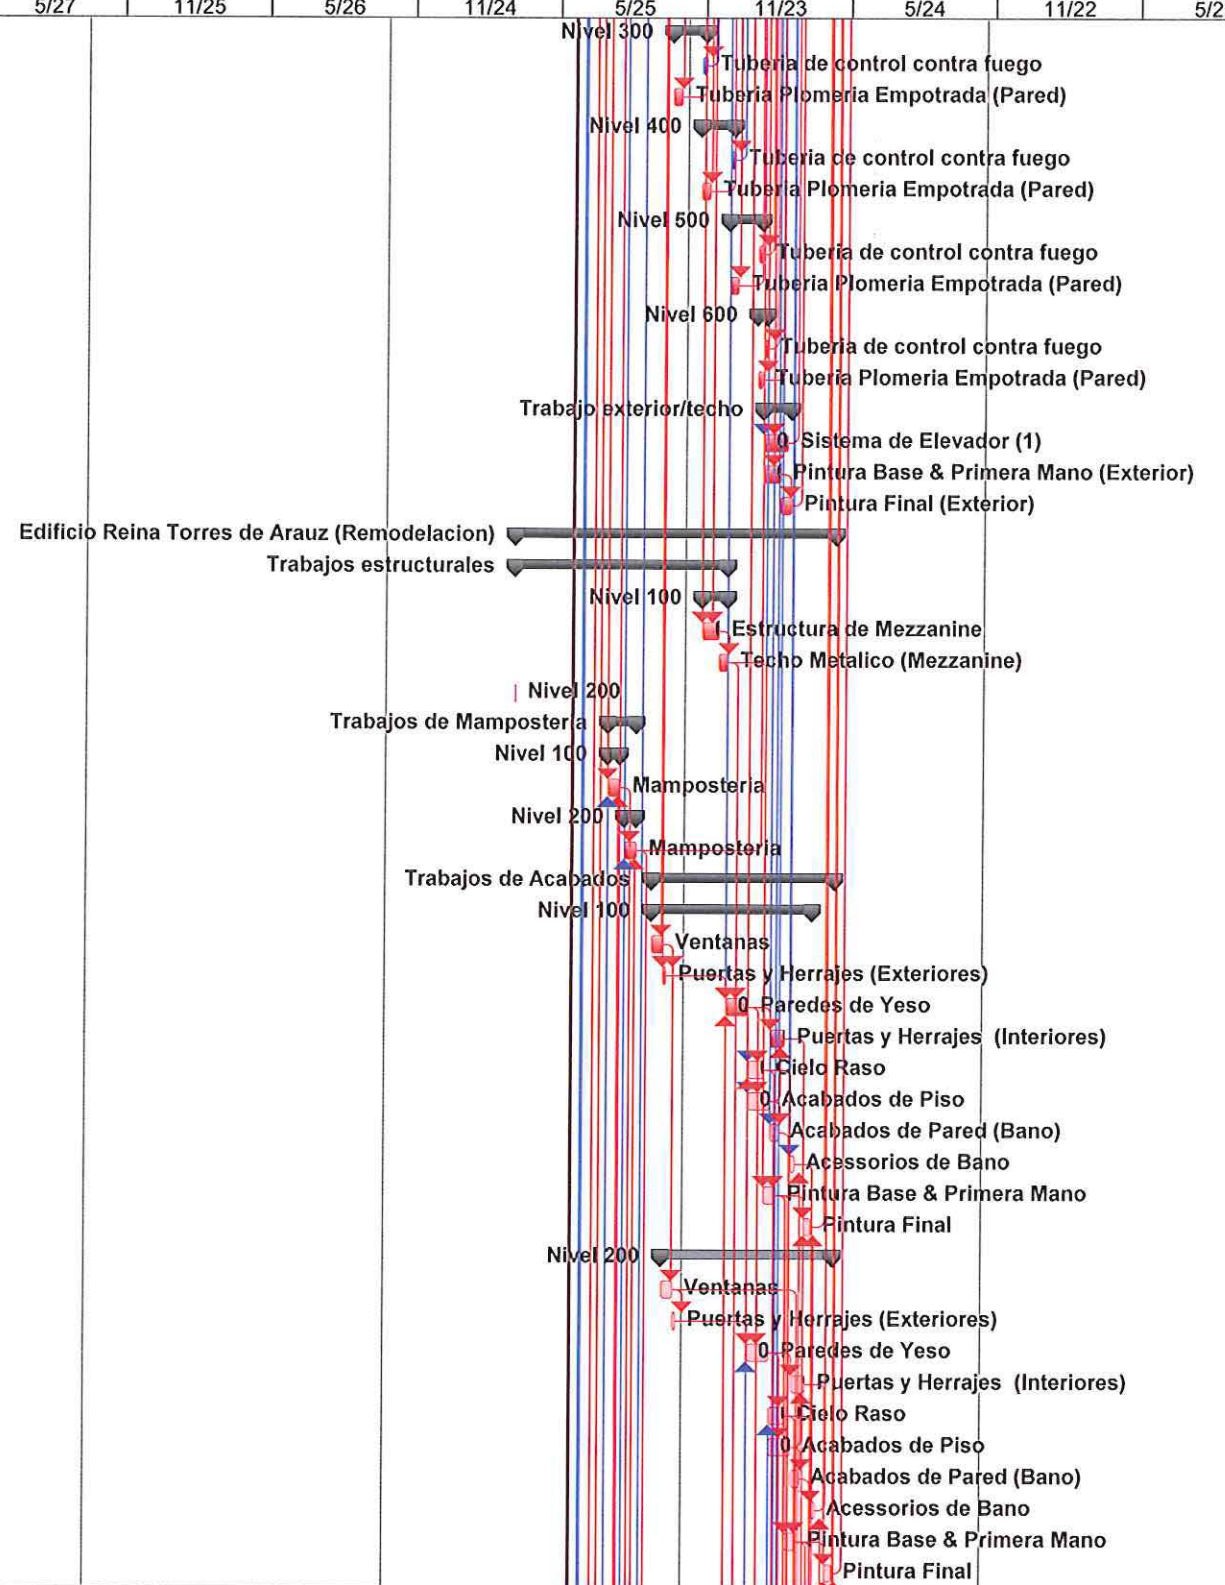

PROYECTO : CIUDAD DE LAS ARTES

TIME IMPACT ANALYSIS #1B

OMEGA ENGINEERING, INC



Id	Tarea	Duracion	% Completado	Comienzo	Terminacion	Gantt Chart										
						2010	octubre 1, 2011		octubre 11, 2012		octubre 21, 2013		noviembre 1, 2014		noviembre 11, 2015	
						5/29	11/27	5/27	11/25	5/26	11/24	5/25	11/23	5/24	11/22	5/22
951	<b>Trabajos electricos</b>	306.09 días	0%	vie 6/27/14	mié 4/29/15	Trabajos electricos										
952	<b>Nivel 100</b>	278.09 días	0%	vie 6/27/14	mié 4/1/15	Nivel 100										
953	Demolicion & Tuberia de sistema especiales (Telefono & CCTV)	9.6 días	0%	vie 7/18/14	dom 7/27/14	Demolicion & Tuberia de sistema especiales (Telefono & CCTV)										
954	Demolicion selectiva & Tuberia de electrica	21 días	0%	vie 6/27/14	vie 7/18/14	Demolicion selectiva & Tuberia de electrica										
955	Cableado electrico	18 días	0%	mar 1/20/15	sáb 2/7/15	Cableado electrico										
956	Accesorios de Electricidad y sistema especiales	18 días	0%	mar 2/24/15	sáb 3/14/15	Accesorios de Electricidad y sistema especiales										
957	Lamparas	16 días	0%	sáb 3/14/15	lun 3/30/15	Lamparas										
958	Equipo de Alarma contra incendio	18 días	0%	sáb 3/14/15	mié 4/1/15	Equipo de Alarma contra incendio										
959	<b>Nivel 200</b>	285.09 días	0%	vie 7/18/14	mié 4/29/15	Nivel 200										
960	Demolicion selectiva & Tuberia de electrica	21 días	0%	vie 7/18/14	vie 8/8/14	Demolicion selectiva & Tuberia de electrica										
961	Demolicion & Tuberia de sistema especiales (Telefono & CCTV)	9.6 días	0%	vie 8/8/14	dom 8/17/14	Demolicion & Tuberia de sistema especiales (Telefono & CCTV)										
962	Cableado electrico	18 días	0%	mar 2/17/15	sáb 3/7/15	Cableado electrico										
963	Accesorios de Electricidad y sistema especiales	18 días	0%	mar 3/24/15	sáb 4/11/15	Accesorios de Electricidad y sistema especial										
964	Lamparas	16 días	0%	sáb 4/11/15	lun 4/27/15	Lamparas										
965	Equipo de Alarma contra incendio	18 días	0%	sáb 4/11/15	mié 4/29/15	Equipo de Alarma contra incendio										
966	<b>Trabajos plomeria/mecanica</b>	304.36 días	0%	mié 6/11/14	sáb 4/11/15	Trabajos plomeria/mecanica										
967	<b>Nivel 100</b>	276.36 días	0%	mié 6/11/14	sáb 3/14/15	Nivel 100										
968	Aparatos Sanitarios	14 días	0%	dom 3/1/15	sáb 3/14/15	Aparatos Sanitarios										
969	Rociadores de Fuego	16 días	0%	lun 2/9/15	mié 2/25/15	Rociadores de Fuego										
970	Dispositivos de AA	16 días	0%	lun 2/9/15	mié 2/25/15	Dispositivos de AA										
971	Ductos de AA	28 días	0%	lun 8/11/14	lun 9/8/14	Ductos de AA										
972	Tuberia de plomeria	21 días	0%	mié 6/11/14	mié 7/2/14	Tuberia de plomeria										
973	Tuberia de control contra fuego	18 días	0%	lun 9/8/14	vie 9/26/14	Tuberia de control contra fuego										
974	<b>Nivel 200</b>	283.36 días	0%	mié 7/2/14	sáb 4/11/15	Nivel 200										
975	Ductos de AA	28 días	0%	lun 9/8/14	lun 10/6/14	Ductos de AA										
976	Tuberia de plomeria	21 días	0%	mié 7/2/14	mié 7/23/14	Tuberia de plomeria										
977	Tuberia de control contra fuego	18 días	0%	lun 10/6/14	vie 10/24/14	Tuberia de control contra fuego										
978	Aparatos Sanitarios	14 días	0%	dom 3/29/15	sáb 4/11/15	Aparatos Sanitarios										
979	Rociadores de Fuego	18 días	0%	lun 3/9/15	vie 3/27/15	Rociadores de Fuego										
980	Dispositivos de AA	18 días	0%	lun 3/9/15	vie 3/27/15	Dispositivos de AA										
981	<b>Trabajo exterior/techo</b>	253.49 días	0%	dom 8/17/14	mar 4/28/15	Trabajo exterior/techo										
982	Maquinas de AA	11.2 días	0%	mar 12/23/14	sáb 1/3/15	Maquinas de AA										
983	Sistema de Impermeabilizacion	28 días	0%	dom 8/17/14	dom 9/14/14	Sistema de Impermeabilizacion										
984	Pintura Base & Primera Mano (Exterior)	21 días	0%	mar 3/24/15	mar 4/14/15	Pintura Base & Primera Mano (Exterior)										
985	Pintura Final (Exterior)	14 días	0%	mar 4/14/15	mar 4/28/15	Pintura Final (Exterior)										

PROYECTO : CIUDAD DE LAS ARTES

TIME IMPACT ANALYSIS #1B

OMEGA ENGINEERING, INC

